



МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

Улсын Их Хурлын саналын дагуу хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

## ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАНГАЛТГҮЙ БАЙЖЭЭ

Бүс, орон нутгийн хөгжилд зориулж олгосон  
хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн, орон нутгийн  
оролцоо

# Агуулга

## Тайланг бэлтгэсэн:

### ҮАГ-ын Нэгдүгээр газар

Газрын захирал

Д.Ганбилэгэ

Аудитын менежер

Ж.Батсайхан

Ахлах аудитор

Л.Одгэрэл

Аудитор

А.Сүхбаатар

Д.Гандолгор

Шинжээч

Ц.Эрдэнэчулуун

П.Цэнгүүн

Хянасан

Аудитын менежер

Ж.Батсайхан

2007 оны 10 дугаар сар

Уг тайланг ҮАГ-ын  
Веб сайтаас үзнэ үү:

[www.mnao.pmis.gov.mn](http://www.mnao.pmis.gov.mn)

Аудитын тайлантай  
холбоотой асуудлаар нэмж  
тодруулах, асууж лавлах зүйл  
байвал 261628 дугаарын утас,  
323266 дугаарын факсаар  
харилцана уу.

### ХАЯГ:

Үндэсний аудитын газар  
Засгийн газрын 4 дүгээр байр,  
Бага тойруу-6, Улаанбаатар-46  
Монгол Улс

Товчилсон үгсийн жагсаалт . . . . . 2

Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй . . 3

## Бүлэг 1

### Зарим төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт орон нутгийн ажилтай уялдаагүй байна

I.1 Төсөл, арга хэмжээг орон нутгийн төр, захиргааны байгууллага иргэдийн саналыг үндэслэн төлөвлөжээ.....4

I.2 Төлөвлөгөөнд зохицуулалт хийжээ.....5

## Бүлэг 2

### Бэлтгэсэн хөрөнгийг данс бүртгэлд бүрэн тусгаагүй байна.

II.1 Зарим төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг зохих журмын дагуу санхүүжүүлээгүй үлдэгдлийг төсөвт буцааж төвлөрүүлээгүй байна .....6

II.2 Зарим төсөл, арга хэмжээг гэрээт хугацаанд хийгээгүй, шаардлага хангасан хөрөнгө нийлүүлээгүй байна.....8

II.3 Төсөл, арга хэмжээний үр дүнд бэлтгэсэн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаагүй, хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаагүй байна .....11

II.4 Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг зохих журмын дагуу сонгоогүй байна.....11

II.5 “Орон нутгийг мэдээлэлжүүлэх” төслийн ажил дуусаагүй, улсын комисс хүлээж аваагүй байна.....12

### **Бүлэг 3**

---

#### **Ажлын гүйцэтгэлд тавих хяналт хангалтгүй байжээ.**

III.1 Орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагаас хөрөнгийн зарцуулалт, ажлын гүйцэтгэлд тавих хяналт хангалтгүй байна.....15

III.2 Зарим төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд орон нутгийн иргэдийн оролцоо хангалтгүй байсан байна.....15

**ДҮГНЭЛТ... .. 17**

**Холбогдох байгууллагын санал ... .. 18**

**ЗӨВЛӨМЖ... .. 20**

**Хавсралт А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З ... .. 22**

# Товчилсон үгийн жагсаалт

УИХ	Улсын Их Хурал
МУЗГ	Монгол Улсын Засгийн Газар
ҮАГ	Үндэсний аудитын газар
СЭЗЯ	Санхүү, эдийн засгийн яам (хуучин нэрээр)
ҮТЕГ	Үндэсний татварын ерөнхий газар
УМХГ	Улсын мэргэжлийн хяналтын газар
ХК	Хувьцаат компани
ХХК	Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
ИТХ	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
ЗДТГ	Засаг даргын тамгын газар
БНХАУ	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
СБД	Сүхбаатар дүүрэг
БГД	Баянгол дүүрэг
СХД	Сонгино хайрхан дүүрэг
ЧД	Чингэлтэй дүүрэг
ХУД	Хан - Уул дүүрэг
БЗД	Баянзүрх дүүрэг
УЦС	Усан цахилгаан станц
БХБЯ	Барилга, хот байгуулалтын яам
БХБТГ	Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар
ТББ	Төрийн бус байгууллага
ЗАА	Захирагчийн ажлын алба
НААҮГ	Нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний газар

## **Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй**

Аудитыг УИХ-ын Эдийн засгийн Байнгын хорооны санал, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт Үндэсний аудитын газраас 2007 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд хийв.

“Бүс, орон нутгийн хөгжилд зориулж 2006 онд төсвөөс олгосон 7,6 тэрбум төгрөгийн зарцуулалт, үр дүн, орон нутгийн оролцоо” гэсэн асуудлаар аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулахад аудитын зорилт чиглэгдлээ.

Аудитаар Сангийн яамны Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Төрийн сангийн газар, Шадар сайдын ажлын алба, аймаг, нийслэлийн Төрийн сангийн газраас гаргасан судалгаа, тайлан, гүйцэтгэлийн баримтууд, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2006 оны санхүүгийн болон татварын тайлан, мэдээ, холбогдох санхүүгийн баримтуудыг шалгав.

Аудитыг гүйцэтгэхдээ Төрийн хяналт шалгалтын стандарт, түүнийг хэрэгжүүлэх аргачилсан зөвлөмж, Гүйцэтгэлийн шалгалтын журам, Гүйцэтгэлийн аудитын гарын авлага, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг мөрдлөг болгосны зэрэгцээ холбогдох албаны мэргэжилтэн, иргэдтэй ярилцлага хийх, судалгаа, тоон мэдээлэл авах, дүн шинжилгээ хийх зэрэг гүйцэтгэлийн аудитын арга зүйг ашиглаж, аудитын дүн, дүгнэлтэд дэмжлэг болох нотлох зүйлс, холбогдох мэдээ судалгааг ажлын баримт материалд хавсаргав.

# Бүлэг 1

## **Зарим төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт орон нутгийн ажилтай уялдаагүй байна**

### **1.1 Төсөл, арга хэмжээг орон нутгийн төр, захиргааны байгууллага иргэдийн саналыг үндэслэн төлөвлөжээ**

1.1 Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2006 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт батлах тухай Засгийн газрын 2006 оны 19 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар “Улсын төсвийн хөрөнгөөр бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ”-ний жагсаалтыг баталсан байна.

1.2 Энэ жагсаалтаар 175 төсөл, арга хэмжээнд 7,6 тэрбум төгрөг төлөвлөж, энэ арга хэмжээг нийслэл, аймаг, сум бүрт хэрэгжүүлэх шийдвэр гарчээ. /Хавсралт А/

1.3 Дээрх төсөл, арга хэмжээнд зарцуулах 7,6 тэрбум төгрөгийг Шадар сайдын төсвийн багцад оруулан баталж, санхүүжилт, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг түүнд даалгасан байна.

1.4 Бүс, орон нутгийн хөгжилд зориулж олгосон хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхдөө аймаг, орон нутгийн мэргэшсэн төсөвчид төсөл, арга хэмжээний төсвийг баталгаажуулж, аймгийн хөрөнгө оруулалт, захиалагчийн албаар дамжуулан аймгийн ЗДТГ нэгтгэж, ИТХ-аар төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг баталсан байна.

1.5 УИХ-ын гишүүдийн тойрогтоо хийх ажил, мөрийн хөтөлбөрийг орон нутгийн засаг захиргаа, иргэдийн санал хүсэлттэй уялдуулан уг төсөл, арга хэмжээний саналыг Шадар сайдын ажлын албаны Бүсчилсэн хөгжлийн үндэсний хорооны ажлын алба хянаж нэгтгэсэн байна.

1.6 Гэвч төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, хөрөнгийн хуваарилалт зарим аймаг, орон нутгийн хувьд тэдний хэрэгцээ шаардлагыг харгалзаж үзээгүй, тухайн орон нутгийн бодлого шийдвэртэй нийцээгүй байна. Тухайлбал,

- Хэнтий аймагт хэрэгжүүлэх 6 төсөл, арга хэмжээ орон нутгийн төрийн байгууллагын ажлын төлөвлөгөөтэй уялдаагүй байна.

Хэнтий аймгийн 2006 оны бараа , ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөөнд Жаргалтхаан сумын соёл, спортын төвийн барилгыг засварлах, Баянмөнх, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр зэрэг 8 сумыг хөгжмийн тоног төхөөрөмжөөр хангах, Нэгдсэн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж авах, Уламжлалт анагаах ухааны төвд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, Мөрөн суманд Цахилгаан дамжуулах шугам барих, соёлын төвийн барилгыг засварлах ажлууд тусгагдаагүй байна.

- Ховд аймгийн Буянт голын ус хуваарилах байгууламж ашиглалтад ороогүй, уг байгууламжийг ногоочид, зарим иргэд үр ашиггүй гэж тооцжээ. Мөст суманд Манхан сумаас өндөр хүчдэлийн шугам сүлжээ барихаар шийдвэрлэсэн атал суманд усан цахилгаан станц барина гэсэн нь байна.

## **1.2 Төлөвлөгөөнд зохицуулалт хийжээ**

1.7 Засгийн газрын 2006 оны 19 дүгээр тогтоолын 3 дугаар заалт, УИХ-ын гишүүд, аймгийн Засаг дарга нарын санал, хүсэлтийг үндэслэн 2006 оны 6 дугаар сараас 12 дугаар сарын хооронд Шадар сайд, Сангийн сайдын 9 удаагийн хамтарсан тушаалаар төсөл, арга хэмжээний батлагдсан дүнд багтаан зохицуулалт хийсэн байна. Үүнд:

д/д	огноо	Тушаалын дугаар	Дүн /сая төгрөг/	Зохицуулсан төсөл, арга хэмжээний тоо	
				батлагдсан	зохицуулсан
1	2007.06.02	51/173	432,7	5	8
2	2007.07.05	62/217	1942,8	29	29
3	2007.07.27	74/242	375,0	9	24
4	2007.09.01	77/279	194,28	5	4
5	2007.09.01	78/280	313,7	6	11
6	2007.11.06	108/350	194,28	2	5
7	2007.12.14	119/409	399,82	6	15
8	2007.12.18	126/416	100,0	1	5
9	2007.12.26	127/442	19,7	1	1
	Нийт дүн		3972,28	64	102

1.8 Зохицуулалт хийгдсэн төсөл, арга хэмжээний дийлэнх хэрэгжсэн байна.

1.9 Гэвч Шадар сайд, Сангийн сайдын 2006 оны 74/242 дугаар тушаалаар Хэнтий аймгийн Бэрх тосгоны цэцэрлэгийн засварын ажилд зориулж батлагдсан 49,0 сая төгрөгөөс 24.0 сая төгрөгийг уг цэцэрлэгийн засварт, үлдсэнийг Баянхутаг, Норовлин сумын сургуулийн барилгын засвар болон Бэрх тосгонд ундны ус, хог тээврийн автомашин авахад зарцуулахаар зохицуулалт хийсэн боловч Бэрх тосгоны цэцэрлэгийн засварт уг хөрөнгө зарцуулагдсан байсан учир нэмж төлөвлөсөн ажлууд биелэгдэх боломжгүй болжээ.

1.10 Шадар сайд, Сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар Нийслэлд хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээний зориулалтыг өөрчилж, тавилга, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл бэлтгэхээр зохицуулахдаа төсөл, арга хэмжээний ач холбогдлыг үнэлж тооцсонгүй. Тухайлбал, 2006 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн Шадар сайд, Сангийн сайдын 62/217 дугаар тушаалаар “ Сонгуулийн 72 дугаар тойрогт “ 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт орших “Хүчит шонхор” захаас Баянхошууны засмал зам хүртэлх 2,1 км шороон замыг сайжруулах” –д зарцуулах 97,1 сая төгрөгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 119/409 дүгээр тушаалаар Чингэлтэй дүүргийн 7,8,9,10,11,12 дугаар хороонд тавилга, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж авахаар оны эцэст зохицуулалт хийжээ.

## **Бүлэг 2** *данс бүртгэлд бүрэн тусгаагүй байна* **Бэлтгэсэн хөрөнгийг**

### ***II.1 Зарим төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг зохих журмын дагуу санхүүжүүлээгүй, үлдэгдлийг төсөвт буцааж төвлөрүүлээгүй байна***

2.1 Санхүү, эдийн засгийн сайдын /хуучин нэрээр/ 2001 оны 174 дүгээр тушаалаар батлагдсан “ Улсын төвлөрсөн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, угсрагдахгүй тоног төхөөрөмж, их засварын ажлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих журам”-ын 3.2-т “Санхүү, эдийн засгийн яам төвлөрсөн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээ, зам, барилга байгууламж, тоног, төхөөрөмж, их засварын ажлыг батлагдсан хөрөнгө, жагсаалтын дагуу хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, их засварын баримт, материалыг<sup>1</sup> үндэслэн санхүүжүүлнэ” гэж заасны дагуу Сангийн яамны Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс 7451,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эрх нээж 7436,8 сая төгрөгийг Шадар сайдын төсвийн харилцах дансанд шилжүүлсэн байна.

2.2 Харин Сангийн яам Хэнтий аймгийн Өндөрхаан сумын Нэгдсэн эмнэлгийн Сэхээн амьдруулах тасагт нийлүүлэх 14,2 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн санхүүжилтийг “Залуус сан” байгууллагад шууд шилжүүлсэн байна.

2.3 Сангийн яамнаас бүс, орон нутгийн хөгжилд зориулж аймаг, нийслэлийн төрийн сангийн газарт 7451,0 сая төгрөгийн санхүүжилт хийжээ. /Хавсралт А,Г/


2.4 Төвийн бүсийн 18 төсөл, арга хэмжээнд 986,4 сая, Баруун бүсийн 25 төсөл арга хэмжээнд 874,9 сая, Зүүн бүсийн 12 төсөл арга хэмжээнд 507,4 сая, Хангайн бүсийн 19 төсөл арга хэмжээнд 1140,6 сая, Улаанбаатар бүсийн 64 төсөл арга хэмжээнд 1646,2 сая, орон нутгийг мэдээлэлжүүлэх төсөлд 2099,6 сая, нийт 138 төсөл, арга хэмжээнд 7255,0 сая төгрөгийг гүйцэтгэгчид олгосон байна. /Хавсралт А, Б, В, Г/

2.5 Дээрх хөрөнгийн зарцуулалтыг бүтцийн хувьд авч үзвэл дараахь байдалтай байна.

<sup>1</sup> Журмаар баримт материалд батлагдсан зураг, төсөл; тендерийн хорооны тогтоол буюу зөвлөмж; захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан ажил үүрэг гүйцэтгэх гэрээ; барилга угсралт, засварын ажил гүйцэтгэх график; санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарь; эргэж төлөгдөх нөхцлөөр олгох зээлийн гэрээ; захиалагчаар баталгаажуулсан барилга байгууламжийн болон засварын ажлын гүйцэтгэл, ашиглалтад хүлээн авсан акт; эрх бүхий байгууллагын батлан гаргасан шийдвэр, барилга, байгууламж, засварын ажлын норм, нормативууд багтдаг байна.



**Төсөл арга хэмжээний нийт хөрөнгийн зарцуулалт**

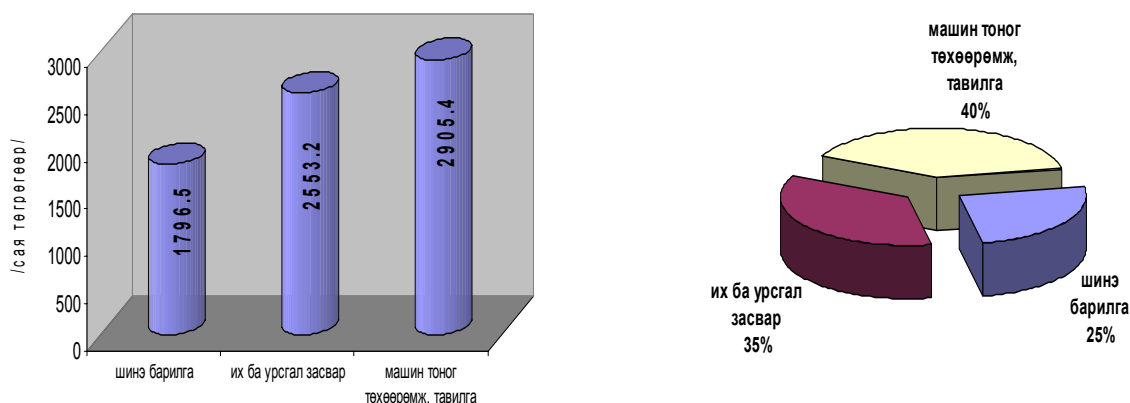

2.6 Сангийн яам нийт санхүүжилтийн 43,0 хувь буюу 3,201.6 сая төгрөгийг 12 дугаар сард, түүний 34,1 хувь буюу 2,542.0 сая төгрөгийг 12 дугаар сарын 20-ноос хойш санхүүжүүлсэн байна.

Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлсэн байдал

сарууд	Үнийн дүн / сая. төг/	Нийт санхүүжилтэд эзлэх хувь
6	76,1	1,0
7	276,9	3,4
8	839,8	11,3
9	556,3	7,5
10	1,107,0	14,8
11	1,417,3	19,0
12	3,177,6	43,0
Дүн	7451,0	100,0

2.7 Сангийн яам зохих баримтыг үндэслэн санхүүжилтийн эрхийг нээж санхүүжүүлсэн боловч тендерийг оройтуулж зарласан, төсөл, арга хэмжээнд зохицуулалт хийсэн, орон нутаг ажлын гүйцэтгэлийн баримтыг хугацаа алдаж ирүүлснээс санхүүжилт оройтсон байна. Тухайлбал,

- Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын халуун усны барилгын ажлын гэрээг 2006 оны 11 дүгээр сарын 12-нд хийсэн ба Сангийн яам 2006 оны 12 дугаар сарын 18-нд хүлээн авсан гэсэн акт, ажлын гүйцэтгэлийг үндэслэн 2006 оны 12 дугаар сарын 18-нд 13,0 сая, 2006 оны 12 дугаар сарын 28-д 1.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эрх нээн санхүүжүүлсэн байна.
- Баянзүрх дүүргийн 111 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын танхим барих ажлын гэрээг 2006 оны 11 дүгээр сарын 21-нд хийсэн ба Сангийн яам ажлын гүйцэтгэлийг үндэслэн 2006 оны 12 дугаар сарын 5-нд 29.0 сая, 2006 оны 12 дугаар сарын 19-нд 68.1 сая, нийт 97.1 сая төгрөгийн эрх нээж санхүүжүүлсэн байна.
- Ховд аймгийн Мөст сумын Усан цахилгаан станцын зураг төсвийн ажлын гэрээг 2006 оны 12 дугаар сарын 20-нд хийсэн ба Сангийн яам 2006 оны 12 дугаар сарын 25-нд хүлээн авсан актыг үндэслэн 2006 оны 12 дугаар сарын 25-нд 30.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эрх нээж санхүүжүүлсэн байна.

2.8 Захиалагч, гүйцэтгэгч нарын хооронд ажлын уялдаа холбоогүй, гэрээний дагуу хариуцлага тооцож хяналт тавиагүйгээс нийт төсөл арга хэмжээний 29 буюу 16,6 хувь нь дуусаагүй, 4,6 хувь буюу 8 төсөл, арга хэмжээ огт хийгдээгүй байгаа ба нийслэл, аймгийн төрийн сангийн газраас хяналт хангалтгүй хийснээс Сангийн яамнаас 3235,4 сая төгрөгийн санхүүжилтийг гүйцэтгэлийн хуурамч баримт (гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, ажил хүлээн авсан акт, ЗД-ын тодорхойлолт)-аар авч гүйцэтгэгчид олгосон байна./Хавсралт А,Е /

2.9 Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний батлагдсан төсвөөс Сангийн яаманд 149,0 сая, аймаг, нийслэлийн төрийн сангийн газарт 196,0 сая төгрөг тус тус зарцуулагдаагүй үлдсэн байна. Аудитаар 209,8 сая төгрөг зарцуулагдаагүй үлдсэнийг тогтоож, 211,6 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгаж, 94,8 сая төгрөгийг төлүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. /Хавсралт Д/

2.10 Аймаг, орон нутгийн төсөв, иргэд байгууллагын хандиваар 18 төсөл арга хэмжээнд 493,3 сая төгрөгийн нэмэлт хөрөнгө гаргасан байна. / Хавсралт А/

**II.2 Зарим төсөл, арга хэмжээг гэрээт хугацаанд хийгээгүй, шаардлага хангасан хөрөнгө нийлүүлээгүй байна**

2.11 Төсөл, арга хэмжээний 64,0 хувь гэрээнд заасан хугацаанд хэрэгжсэн бөгөөд 36,0 хувь санхүүжилт хугацаандаа ирээгүй, зориулалт, ажлын хэмжээ өөрчлөгдсөн, ажлын шинж чанараас шалтгаалж хүйтэнд хийж чадахгүй болсон, газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй, гүйцэтгэгч хариуцлага алдсан гэх мэт шалтгаанаар 3-270 хоног хоцорч хэрэгжсэн байна. Дуусаагүй ажлыг 2007 оны 6 дугаар сарын 1-ний байдлаар харуулбал: /Хавсралт Б,Е/

Бүсийн нэр	Төсөл, арга хэмжээний нийт тоо	Дуусаагүй төсөл, арга хэмжээ	Хийгдээгүй төсөл, арга хэмжээ	Гэрээт хугацаанд нь ашиглалтад өгөөгүй төсөл, арга хэмжээ
Төв	20	2	0	10
Баруун	30	4	1	9
Зүүн	21	6	3	11
Хангай	30	9	2	19
Улаанбаатар	73	7	2	13
Мэдээлэлжүүлэх төсөл	1	1	0	1
<b>Нийт дүн</b>	<b>175</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>63</b>


2.12 Хөрөнгө оруулалтаар Ховд аймгийн Хүүхдийн төлөө төв, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, Ерөнхий боловсролын сургуулиудад 83,0 сая төгрөгийн 18 нэр төрлийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хөрөнгийг 29 төсөвт байгууллагад тендергүйгээр бэлтгэсэн байна. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 22,1 сая төгрөгийн хөрөнгө материал бэлтгэн нийлүүлсэн “Авга ач нар” ХХК-ийн гэрээг албан ёсоор дүгнээгүй, анхан шатны баримт дутуу байна.

2.13 Орхон аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт “Бүрэнхайрхан” ХХК, “Моносфарм” ХХК, “Азиател” ХХК, “Эрдэнэс” ХХК –ийн нийлүүлсэн эмнэлгийн зарим багаж, төхөөрөмж нь хуучин ашиглагдаж байсан, техникийн үзүүлэлт хангалтгүй, хэрэгцээ шаардлагаас илүү хэмжээтэйгээр 15,6 сая төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжийг үр ашиггүй бэлтгэжээ. Тухайлбал,

- Худалдан авсан 2 ширхэг автоклав 1986, 1991 онд үйлдвэрлэгдсэн, урьд нь ашиглагдаж байсан, хуучин, монаметр ажиллагаагүй, мэс заслын хажуугийн гэрэл нь хүчин чадал муутайгаас мэс ажилбар хийх шаардлага хангахгүй байна. “Эрдэнэс” ХХК –ийн нийлүүлсэн 2 микроавтобус хөдөө орон нутагт явж эмнэлгийн түргэн тусламжийн үйлчилгээ хүргэх нөхцөл шаардлагыг хангахгүй байна.

2.14 Төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад нийт 2905,4 сая төгрөгийн хөрөнгө бэлтгэгдсэн бөгөөд үүнээс мэдээлэлжүүлэх төсөлд зарцуулсан 2099,6 сая төгрөгийг оруулалгүй тооцвол хөрөнгийн 58,3 хувь Улаанбаатарын бүсэд бэлтгэгдсэн байна. Гэвч зарим хөрөнгө, тоног төхөөрөмж зохих эзэндээ очоогүй, төлөвлөсөн зарим ажлууд хийгдээгүй, хийгдсэн ч чанар муутай байна.

Төсөл, арга хэмжээний үр дүнд бэлтгэн нийлүүлсэн хөрөнгө /сая.төг/

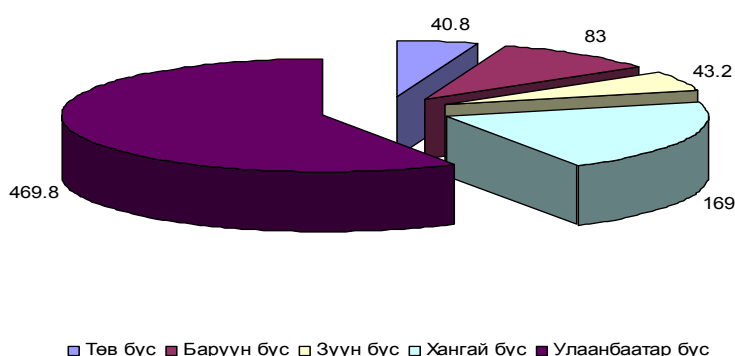


- “Нуган трейд” ХХК Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хорооны өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн тухай ажлын гүйцэтгэлийн актыг 2 удаа хийж, хянаж баталгаажуулсан боловч уг хөрөнгө зохих байгууллагад очоогүй байна.



2007.06.08-ны байдлаар Нуган трейд ХХК-ийн нийлүүлэхээр бэлтгэсэн 76.3 сая төгрөгийн 11 төрлийн тоног төхөөрөмж ЧД-ийн 18 дугаар хорооны агуулахад байна.

- “Дорнын Өргөө” ХХК –ийн СХД-ийн 1 дүгээр хороонд Спорт заал барих ажил хийгдээгүй, “Танан импекс” ХХК ЧД-ийн 14 дүгээр хороонд худаг гаргаагүй, түүнд зохицуулалт хийж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж бэлтгэсэн боловч зохих эмнэлэгт очоогүй байна.
- СБД-ийн 1,2 дугаар хорооны байрны дундах зам засварын ажлын гүйцэтгэгч “Бат зам” ХХК-ийн ажилтай танилцахад

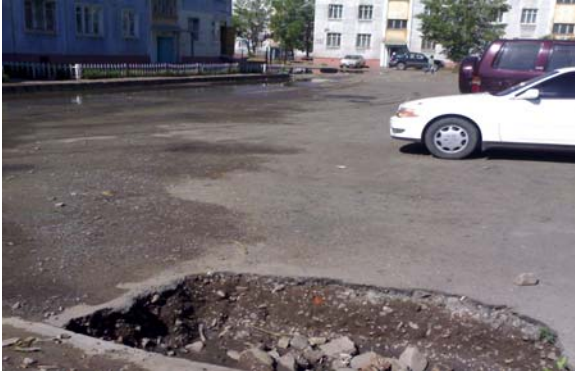

СБД-ийн 1 дүгээр хорооны 220-н мянгатын 25, 26 дугаар байрын ар талын замын хашлага зам хоёрын хооронд асфальт дэвсээгүй, засварласан зогсоолын талбай цөмөрсөн байна.

СБД-ийн 2 дугаар хороо 3 дугаар байрын ар талын замд шороо асгаснаас өөр ажил хийгдээгүй байна.



СБД-ийн 2 дугаар хороо 29, 2б, 1а дугаар байрын дундах замын асфальтон хучилт нь дутуу хийгдсэнээс бэхжээгүй, хагарч бутарсан байна.

- СХД-ийн 1-6 дугаар хорооны цагдаагийн хэсэгт “Хурд интернэшнл” ХХК ОХУ-ын Иж Планета-5 мотоцикль нийлүүлсэн тухай ажлын гүйцэтгэлийн актыг Шадар сайдын ажлын албаны ажилтан С.Оюунцэцэг хянаж, УБ хотын ЗАА-ны инженерийн байгууламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Ган-Очир захиалагчийн үүргийг гүйцэтгэж, СХД-ийн Засаг даргын орлогч Д.Ганболд, Тамгын газрын дарга П.Самдан нар хүлээн авч баталгаажуулсан ч БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн мотоцикл нийлүүлсэн байна.



- Автодубай ХХК-иас СХД-ийн 4-6 дугаар хорооны өрхийн эмнэлэгт нийлүүлсэн хүрэн өнгийн Митсүбиши Эрвиэр маркийн комби машин, ногоон өнгийн Субару легаси маркийн комби, Ниссан плювер маркийн автомашинууд нь 5 хаалгатай, өвчтөнг хэвтүүлж тээвэрлэх боломжтой, стандарт, техникийн шаардлага бүрэн хангасан, техникийн үйлчилгээ, тохируулга бүрэн хийгдсэн, сэлбэг хэрэгслийн олдоц сайтай байх гэсэн гэрээний шаардлагуудыг бүрэн хангаагүй байна.

- “Эльком” ХХК –ийн ЧД-ийн 7-12 дугаар хороодод 2007 оны 2 дугаар сарын 19-нд нийлүүлсэн хог тээвэрлэх зориулалттай 4 авто машин гэрээний техникийн тодорхойлолтыг хангаагүй, шатахуун их зарцуулдаг, зарим машины очлуур эвдэрхий, урд тэнхлэг муу, нум ажилгүй, засч сэлбэх шаардлагатай бөгөөд одоогоор 4 авто машиныг ашиглаагүй, автомашины улсын үзлэгт оруулаагүй байна.



### ***II.3 Төсөл, арга хэмжээний үр дүнд бэлтгэсэн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаагүй, хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаагүй байна***

2.15 Бүс, нутгийн хөгжилд зориулж нийт 175 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлж 7,255.1 сая төгрөгийн хөрөнгө бэлтгэсэн боловч 64,6 хувь буюу 4686,7 сая төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаагүй байна. / Хавсралт В,Ж /

2.16 Данс бүртгэлд тусгаагүй хөрөнгийн 98,6 хувийг Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ эзэлж байна. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг нийслэлийн хөрөнгөд бүртгээгүй, Засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлээгүй байна. Нийслэлийн Санхүү эдийн засаг, төрийн сангийн хэлтэс санхүүжилтийг Улаанбаатар хотын орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2006 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгажээ. Иймд улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн, нийслэлийн өмчид бүртгэгдэх ёстой хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгах шаардлагатай байна.

2.17 Аудитын явцад хийсэн судалгаанаас үзэхэд төсөл, арга хэмжээгээр бэлтгэгдсэн, засварлагдсан хөрөнгийн 85,7 хувийг зориулалтын дагуу ашиглаж, ажлыг бүрэн дуусгаагүй, чанаргүй хийгдсэнээс 14,3 хувийг ашиглаагүй байна. /Хавсралт В,З/

### ***II.4 Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг зохих журмын дагуу сонгоогүй байна***

2.18 Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр нийт 175 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр батлагдсаны 93,7 хувь буюу 163 төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу сонгосон боловч Нийслэлийн ЗДТГ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 71 (давхардсан тоогоор) ажил хийгдсэний 30 ажилд тендер зарлаагүй байна. / Хавсралт Б/

2.19 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 49-ийн 1-д “Захиалагч худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай бүр тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэг бүрдүүлж архивын нэгж болгон хадгална” гэж заасны дагуу тендерийн материалыг Нийслэлийн ЗДТГ архивын нэгж болгоогүй байна.

2.20 Орон нутаг дахь төсөл, арга хэмжээний 57,2 хувийг Улаанбаатар хотын харъяаны, 42,8 хувийг тухайн аймгийн харъяалалтай аж ахуйн нэгж гүйцэтгэсэн байна. Анхны сонгосон гүйцэтгэгчийн 6,3 хувь нь ямар нэгэн шалтгаанаар солигдсон байна. / Хавсралт Б/

2.21 Булган аймгийн төвийн “С.Лхагвадорж баатрын талбай”-н засварын ажлын тендерт 5 компани оролцож “Булган барилга” ХХК шалгаран гэрээ хийгдсэн боловч явцын дунд гүйцэтгэгчийг сольж “Цонхот” ХХК болгосон байна. Гэвч СЯ болон Шадар сайдын ажлын албаны баримт материалд энэ ажлын гүйцэтгэгч “Булган барилга” компанитай гэрээ хийгдсэн материал байна.

2.22 Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын “80 хүүхдийн дотуур байрны засвар” –ын ажлын тендерт “Хөх-Тэнгэр Хөвсгөл” ХХК-ийг шалгаруулсан боловч аймгийн Засаг дарга Б.Батхүү тухайн компани нь сантехникийн мэргэжлийн инженер техникийн ажилтан байхгүй гэсэн шалтгаанаар “Цагаан-Уул Тэрхэн” ХХК-д уг ажлыг гүйцэтгэх эрх олгожээ.

2.23 Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гүйцэтгэгчээр шалгарсан Сүхбаатар аймгийн Шарга ХХК-ийг Улаанбаатар хотын Хадат мянган ХХК-аар сольж ажил үйлчилгээг гүйцэтгүүлсэн боловч ашиглалтад хугацаандаа өгөөгүй байна.

2.24 Архангай аймгийн Өлзийт сумын сургуулийн барилгын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг тендер зарлалгүйгээр сургуулийн багш ажилчид өөрсдийн хүчээр хийж гүйцэтгэсэн байна.

2.25 Баян-Өлгий аймаг хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг тендер зарлан сонгосон боловч Бугат сумын соёлын төвийн барилгын засварын ажлыг гүйцэтгэгч “Ашекей” ХХК 2006 оны 7 дугаар сарын 7-нд байгуулагдсан нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан нөхцөлийг хангаагүй, засварын ажлыг чанаргүй гүйцэтгэжээ.

2.26 Говьсүмбэр аймагт хөрөнгө оруулалтаар 28.3 сая төгрөгийн бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлсэн боловч тендер шалгаруулалт явуулалгүй Улаанбаатар хотын “ТТТ” ХХК-тай шууд гэрээ байгуулан ажилласан байна. Харин гүйцэтгэгч байгууллага нь гэрээний нөхцөлийг зөрчиж, барааг 14 хоногоор хоцроож нийлүүлсэн байхад гэрээний дагуу хариуцлага тооцоогүй байна.

2.27 Баянхонгор аймгийн ЗДТГ Баацагаан сумын соёлын төвийн засварын ажлыг гүйцэтгүүлэхээр “Рашаант” ХХК-тай тендер зарлалгүйгээр шууд гэрээ байгуулжээ.

### ***II.5 “Орон нутгийг мэдээлэлжүүлэх” төслийн ажил дуусаагүй, улсын комисс хүлээж аваагүй байна***

2.28 “Орон нутгийг мэдээлэлжүүлэх” төслөөр 21 аймгийн төв, Багануур, Зүүнхараа, Хархорин, Налайх зэрэг 4 хотыг 10 сувгийн, 306 сумын төв, Багахангай, Хялганат, Бор-Өндөр, Түнхэл, Хөтөл зэрэг 14 тосгоныг 4 сувгийн тоног төхөөрөмжөөр ханган олон сувгийн нэвтрүүлэг үзэх станцыг суурилуулан ашиглалтад оруулахад зориулж 2099,6 сая төгрөгийг санхүүжүүлсэн байна.

2.29 “Орон нутгийг мэдээлэлжүүлэх” төслийн телевизийн нэвтрүүлгийн олон сувгийн газрын сүлжээний 353 ширхэг иж бүрдэл, 1897,1 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээг 2006 оны 9 дүгээр сарын 1-нд Сансар кабель ХХК-тай хийсэн байна.

2.30 Дээрх тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэх, суурилуулах, ашиглалтад оруулах ажлыг “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК, “Монголын цахилгаан холбоо” ХК гүйцэтгэхээр Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газартай гэрээ хийн 202,5 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан байна.

2.31 “Сансар кабель” ХХК гэрээнд зааснаар 2006 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдөр гэхэд сүүлчийн хэсгийг хүлээлгэн өгнө гэсэн боловч эхний хэсгийг 2006 оны 11 дүгээр сарын 25-нд, сүүлчийн хэсгийг 2007 оны 1 дүгээр сарын 10-нд, нийт 347 ширхэг иж бүрдэл тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн байна. Гэрээгээр нийлүүлэх тоног төхөөрөмжөөс 6 ширхэг иж бүрдэл, нэмж нийлүүлэхээр тохиролцсон 8 иж бүрдлийг нийлүүлээгүйгээс станц суурилуулах ажил хийгдээгүй байна. Үүнд:

Суурин газрын нэр	Нийлүүлээгүй станцын тоо		
	Гэрээнд заасан	Нэмэлтээр өгөх	Станцын хүчин чадал
1.Төв аймгийн Алтанбулаг сум	1		ICTA-50
2. Дархан Уул аймгийн төв	1		ICTA-500
3. Орхон Уул аймгийн төв	1		ICTA-500
4. Сэлэнгэ аймгийн төв	1		ICTA-500
5. Өвөрхангай аймгийн төв	1		ICTA-500
6. Дорнод аймгийн төв	1		ICTA-500
7.Архангай аймгийн малчны хороо		1	ICTA-50
8. Баян Өлгий аймгийн Бугат сум		1	ICTA-50
9. Сэлэнгэ аймгийн Модны хороо		1	ICTA-50
10. Улаанбаатар Биокомбинат		1	ICTA-50
11.Улаанбаатар Налайх Городок		1	ICTA-50
12. Улаанбаатар Өлзийт хороо		1	ICTA-50
13. Улаанбаатар Шар хад		1	ICTA-50
14. Улаанбаатар Жаргалант хороо		1	ICTA-50
Нийт дүн	6	8	

2.32 “Сансар кабель” ХХК-ийн баталгаат хугацаанд дараахь аймагт суурилуулсан тоног төхөөрөмж ажиллахгүй байгаа ба түүнийг засварлах талаар ажил хийгээгүй байна.

Аймаг, сумын нэр	Нийлүүлэгдсэн станц	Засварт ирсэн хугацаа
1. Дундгов аймгийн Адаацаг	ICTA-50	2007.04.14
2. Ховд аймгийн Ховд хот	ICTA-200	2007.05.10
3. Багануур хот	ICTA-200	2007.06.06
4. Хэнтий аймгийн Бор Өндөр	ICTA-100	2007.05.14
5. Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр	ICTA-50	2007.05.16
6. Хэнтий аймгийн Баян Адрага	ICTA-50	2007.06.10
7. Төв аймгийн Атар	ICTA-50	2007.06.07
8. Төв аймгийн Архуст	ICTA-50	2007.06.10
9. Орхон аймгийн Говил	ICTA-50	2007.04.25
10. Хөвсгөл аймгийн Бүрэн тогтох	ICTA-50	2007.06.11
11. Сэлэнгэ аймгийн Түшиг	ICTA-50	2007.06.11
дүн	11	

2.33 Станцууд болон дагалдах иж бүрдлүүдийг нийлүүлээгүй, засварлаагүйгээс ашиглалтад өгөх ажил удааширч ажлын болон улсын комисс хүлээн аваагүй бөгөөд суурилуулж дууссан аймаг, сум, сууринд тавигдсан тоног төхөөрөмжийн туршилт, жигдрүүлэлтийн ажил хийгдэж, орон нутагт ямар үнээр, ямар байгууллагын данс бүртгэлд авах шийдвэр гараагүй байгаа ба тээвэрлэх, суурилуулах, ашиглалтад оруулахтай холбогдсон зардалд 128,5 сая төгрөг зарцуулагдаагүй үлдэгдэлтэй байна.



## Бүлэг 3

### Ажлын гүйцэтгэлд тавих хяналт хангалтгүй байжээ

#### **III.1 Орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагаас хөрөнгийн зарцуулалт, ажлын гүйцэтгэлд тавих хяналт хангалтгүй байна**

3.1 Аудитын явцад хийсэн судалгааны дүнгээс үзэхэд нийт хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээний 25,1 хувьд ямар нэгэн хэмжээгээр хяналт шалгалт хийгдсэн, 74,9 хувьд хяналт шалгалт хийгдээгүй байна.

3.2 Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагаас тавих хяналт хангалтгүй байна. /Хавсралт В/

3.3 Тухайлбал: Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын чанар, Хатгал тосгонд ундны усны худаг гаргах ажлын үйл ажиллагаанд захиалагч болон мэргэжлийн байгууллагын зүгээс ямар ч хяналт тавьж ажиллаагүй байна.

3.4 Говьсүмбэр аймгийн Төрийн сангийн хэлтэс ажлын чиг үүргийн дагуу хяналт тавиагүй, “Цахим-Боржигин” мэдээллийн интернет төвд “ТТТ” ХХК-иас нийлүүлсэн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг зөвхөн тоо ширхэгээр хүлээн авсан, чанар, хүчин чадал, ашиглалтын талаар дүгнэлт гаргаагүй байна.

3.5 Нийслэлийн БХБТГ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний шинэ барилга, байгууламж барих 7 ажлыг хийхэд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн ч 1 ажил хийгдээгүй, 3 ажил дуусаагүй байхад ажлын гүйцэтгэлийн актыг урьдчилан хийж, баталгаажуулан эрхээ хэтрүүлсэн байна.

3.6 Нийслэлийн Засаг даргын 2006 оны 382 дугаар захирамжийн дагуу улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн өмчлөгч, ашиглагч байгууллага хяналт тавих ажлыг зохион байгуулаагүй байна.

#### **III.2 Зарим төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд орон нутгийн иргэдийн оролцоо хангалтгүй байжээ**

3.7 Аудитын явцад явуулсан санал асуулга, судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 98,9 хувь төсөл, арга хэмжээг дэмжиж байгаа боловч төсөл, арга хэмжээний ажилд орон нутгийн иргэдийн оролцоо харилцан адилгүй байжээ. /хавсралт В/ Үүнд:

3.8 Говь-Алтай аймгийн хувьд гэрээ, хийгдэх ажлын жагсаалт, зураг төсвийг сум, сургуулийн удирдлагад өгөөгүй, тендер шалгаруулалтад оролцоогүй учраас орон нутгийн оролцоо бага байсан гэж сумын удирдлагууд үзэж байна.

3.9 Төв аймгийн сумдын ЗДТГ, соёлын төвүүдийн хувьд орон нутгийн оролцоо хангалттай байсан гэж үзэж байгаа бол, цагдаагийн хэсгүүдийн барилгын их засвар, машин тоног төхөөрөмж худалдан авахад орон нутаг, сумын оролцоо дунд зэрэг гэж судалгаанд оролцогчид үнэлжээ.

3.10 Сүхбаатар аймгийн Үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, байгаль орчны бодлого зохицуулалтын хэлтэс, Барилга хот байгуулалтын алба, Төрийн сангийн хэлтсийн ажлын уялдаа холбоо хангалтгүй, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, ажлын явц, гүйцэтгэлийн чанарт тавих хяналт суларч, хөрөнгө оруулалтаар баригдах болон засварлах барилга объектуудын санхүүжилтийг гүйцэтгэгч байгууллагад ажлын гүйцэтгэлийг харгалзалгүй шууд шилжүүлснээс ажил үйлчилгээг гэрээний дагуу цаг хугацаанд нь хийхгүй, төсвийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан байна. Үүнд аймгийн удирдлагууд чанарын хяналтыг орхигдуулж, анхаарал тавиагүй байна.

3.11 Хэнтий аймгийн Бэрх тосгоны цэцэрлэгийн барилгын ажлаас бусад хөрөнгө оруулалтын ажилд аймаг, орон нутгийн оролцоо үндсэндээ байсангүй.

3.12 Ховд аймгийн иргэд Манхан сумаас Мөст сум хүртэл өндөр хүчдэлийн шугам сүлжээ барихаар шийдвэрлэсэн тул УЦС барих шаардлагагүй гэж дүгнэж байна.

## Дүгнэлт

Аудитын дүнд үндэслэн дараахь дүгнэлт гаргаж байна. Үүнд:

1. Аудитын явцад хийсэн судалгаанаас үзэхэд нийт төсөл, арга хэмжээний 96,6 хувийг тухайн аймаг, сумын сонгогчид болон орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудаас УИХ-ын гишүүдэд тавьсан санал, хүсэлтийг үндэслэж, аймаг, сумын төрийн захиргааны байгууллагуудын ажилтай уялдуулж төлөвлөсөн байна.
2. Гэвч зарим төсөл, арга хэмжээ орон нутгийн ажилтай уялдаагүй, тэргүүлэх ач холбогдлыг харгалзан үзээгүй, хэрэгжих боломжгүй, үр дүн муутай болжээ. Энэ нь төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, санхүүжилт хугацаа алдсан, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад зохицуулалт, өөрчлөлт хийгдсэн, хяналт суларсан зэргээс шалтгаалжээ.
3. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуульд заасны дагуу тендер зарлахгүй гүйцэтгэгчийг сонгосон нь төсөл, арга хэмжээний ажил чанаргүй болоход нөлөөлсөн байна.
4. “Орон нутгийг мэдээлэлжүүлэх” төслийн ажлыг төлөвлөхдөө шаардагдах тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг алдаж тооцсоноос гүйцэтгэлээр өөр хүчин чадалтай тоног төхөөрөмж угсарч төсөвт өртөг нэмэгдэж, улмаар нэмэлт хөрөнгөгүйгээр төслийн ажлыг дуусгаж чадахгүйд хүрчээ. Төслийн ажлыг дуусгаагүйгээс улсын комисс хүлээж аваагүй, эвдэрсэн тоног төхөөрөмжийг засварлаагүй хугацаа алдсан байна.
5. Нийт санхүүжилтийн ихэнхийг оны эцэс рүү хийсэн, захиалагчийн хяналт хангалтгүй байсан зэргээс шалтгаалан тайлант онд 29 төсөл арга хэмжээ дуусаагүй, 8 төсөл, арга хэмжээ хийгдээгүй ба 2006 оны эцэст аймаг, нийслэлийн төрийн сангийн газарт 196,0 сая төгрөгийн санхүүжүүлээгүй үлдэгдэлтэй байна.
6. Бүс, орон нутгийн хөгжилд зориулж улсын төсвөөс олгосон хөрөнгийн зарцуулалтад орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагаас тавих хяналт сул байснаас илүү санхүүжилт олгосон, гүйцэтгэлийн баримтыг хуурамчаар үйлдэж санхүүжилт авсан, барилгын ажлыг чанаргүй хийсэн, шаардлага хангасан машин, тоног төхөөрөмж нийлүүлээгүй, хөрөнгийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгахгүй орхигдуулсан зэрэг зөрчил илэрлээ.

## Холбогдох байгууллагын Санал



### МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМ

210646 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  
Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1, Засгийн газрын II байр,  
Утас/факс: 26-02-47, <http://www.mof.gov.mn>

2007.11.14 № 79/5239  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ  
АУДИТОР Л.ЖАВЗМАА ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

“Бүс орон нутгийн хөгжилд зориулж олгосон хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн, орон нутгийн оролцоо”-д хийсэн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцлаа.

Гарсан санал дүгнэлт, зөвлөмжид дараах тайлбар, саналыг өгч байна. Үүнд:


1. УИХ-ын гишүүдийн 100,0 сая нийт 7,6 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлэхдээ тухайн аймгийн Засаг дарга, гүйцэтгэгч байгууллагатай байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээ, аймгийн захиалагч болон ерөнхий захиалагчийн хянаж ирүүлсэн гүйцэтгэлийг үндэслэн санхүүжилтийн эрхийг нээж, санхүүжилтийг Ерөнхий захиалагч болох Шадар сайдын ажлын албаны дансанд шилжүүлж байсан. Гишүүдийн хэт жижиглэсэн 200 гаруй гэрээ, гүйцэтгэлийг хүлээн авч хянан санхүүжүүлэхэд хүндрэлтэй байсан ч ирсэн гүйцэтгэлийг 1-2 хоногт багтаан хянаж, санхүүжилтийн эрхийг нээж байсан бөгөөд гүйцэтгэгчээс ямар нэгэн гомдол, санал ирж байгаагүй. Мөн түүнчлэн барилга объектыг ашиглалтад хүлээн авсан комиссын актыг үндэслэн эцсийн санхүүжилтийг хийдэг байсан бөгөөд зарим ашиглалтад ороогүй барилгын хөрөнгийг олгоогүй. Төслийн Е хавсралтад дурдсан объектуудыг санхүүжүүлээгүй шалтгаан нь Сангийн сайдын 2006 оны 395 дугаар тушаалаар батлагдсан “Улсын төсвөөс хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмжийг санхүүжүүлэх, хяналт тавих журам”-ын 2.4-ийн “е” заалтад барилга объектыг ашиглалтад хүлээн авсан тухай ажлын болон улсын комиссын актыг үндэслэн сүүлчийн санхүүжилтийг хийхээр заасан байдаг тул акт ирээгүй барилга байгууламж, төслийн сүүлийн санхүүжилтийг олгоогүй болно. Үүнээс үүсэх хариуцлагыг захиалагч гүйцэтгэгч нар хариуцах журамтай.
2. Төслийн 2-р бүлгийн 2.2 дугаар заалтад дурдсан гүйцэтгэгчид шууд олгосны шалтгаан нь оны эхэнд Шадар сайдын ажлын алба төрийн сангийн дансаа нээлгээгүй байсан, мөн Хэнтий аймгийн Өндөрхаан сумын Нэгдсэн эмнэлэгийн сэхээн амьдруулах тасагт олгосон 14,2 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг УИХ гишүүн өөрөө тухайн үед нь хүлээлгэн өгөх болсонтой холбоотой юм.
3. Нийт санхүүжилтийн ихэнх нь оны эцэст гарсан нь захиалагч орон сууцны дээврийн болон зам засварын ажлын тендерийг оны эцэст зарласан, тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээнүүд 12 сард ирсэн бөгөөд УИХ-ын гишүүд батлагдсан хөрөнгийг өөр барилга, арга хэмжээнд олон удаа шилжүүлсэн, зохицуулсан зэргээс шалтгаалсан юм. Түүнчлэн аймгийн ЗДТГ гэрээ, гүйцэтгэлийн материалыг ихэвчлэн оны эцэс рүү ирүүлсэн бөгөөд харин тус яамнаас ирсэн гүйцэтгэлийг журмын дагуу 1-2 хоногт багтаан хянаж, санхүүжилтийн эрхийг нээж байсан.
4. Сангийн сайдын 2006 оны 11 сарын 29 өдрийн 395 дугаар тушаалаар батлагдсан “Улсын төсвөөс хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмжийг санхүүжүүлэх, хяналт тавих журам”-ын 3.4 дүгээр заалтад Улсын төсвийн хөрөнгийг зориулалт бусаар үр ашиггүй зарцуулсан, барилгын ажлын

08 4980

гүйцэтгэлийг буруу гаргасан хариуцлагыг тухайн Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, газрууд шууд хариуцна гэж заасан байдаг. Гүйцэтгэл буруу гарсан, ажил чанаргүй хийсэн, хяналт муу тавьсан хариуцлагыг захиалагч, аймгийн удирдлага хариуцах ёстой. Учир нь санхүүжилтийг шууд гүйцэтгэгчид олгоогүй, газар дээр нь хяналтыг тавиулж, барилга объектыг цаг хугацаанд нь чанар сайтай ашиглалтад оруулахын тулд аймгийн Засаг даргатай гэрээг байгуулан, хөрөнгийг нь аймгийн төрийн санд шилжүүлж байсан.

5. Зөвлөмжийн төсөлд Сангийн сайд Н.Баяртсайханд “Хууль зөрчиж ажлын гүйцэтгэгч сонгосон, хуурамч баримт үйлдэн санхүүжилт авсан байгууллага, хүмүүст хариуцлага тооцох” гэсэн заалтыг захиалагч шууд хариуцлага тооцох, шүүхэд шилжүүлэх хариуцлагыг гэрээгээр хүлээсэн байдаг тул Ерөнхий захиалагчид буюу Шадар сайдад зөвлөмж болгох нь зүйтэй гэж үзэж байна.
6. Аудитын тайлангаар санал болгосон зөвлөмжийн биелэлтийг ханган ажиллах талаар орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон төсөвт байгууллагуудад өмнөх онд гарсан хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийн биелэлт болон санхүүгийн тайланд тусгасан байдал хангалтгүй байгаа тухай албан даалгавар хүргүүлж, зөрчлийг арилгах талаар хугацаатай үүрэг өгч, зөвлөмжийн биелэлтийг хуулийн хугацаанд тайлагнах болно.

Хүндэтгэсэн,

ДЭД САЙД  Ч.ГАНЗОРИГ

## Зөвлөмж

Аудитын дүн дүгнэлтэд үндэслэн дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг дор дурдсан албан тушаалтанд зөвлөж байна.

### Монгол Улсын Шадар сайд М.Энхсайханд

- Тайлант хугацаанд хийгдээгүй ажлыг хийж дуусгах, Аймаг, нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагууд, иргэдийн үр ашиггүй гэж үзсэн зарим төсөл, арга хэмжээг хэрхэх асуудлыг судалж шийдвэрлэх;
- Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг холбогдох хууль тогтоомж зөрчиж сонгосон байгууллага, албан тушаалтанд арга хэмжээ авах;
- “Орон нутгийг мэдээлэлжүүлэх” төсөлд шаардагдаж байгаа хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэн төслийг дуусгах;
- Хөрөнгийн зарцуулалт, ажлын чанарт тавих хяналтыг сайжруулан аудитаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, аудитын мөрөөр зохиосон ажил, авсан арга хэмжээний тайланг нийслэл, орон нутгийн байгууллагуудаас авч ирүүлэх;
- Хууль зөрчиж ажлын гүйцэтгэгч сонгосон, хуурамч баримт үйлдэн санхүүжилт авсан байгууллага, хүмүүст хариуцлага тооцох;
- Цаашид улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнд бүс, орон нутгийн хөгжилд нэрээр тусад нь төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах нь хэр зохимжтой, үр нөлөөтэй болохыг судлан үзэж, оновчтой байдлаар шийдвэрлүүлэх.

### Сангийн сайд Н. Баяртсайханд:

- Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад тайлант оны эцэст зохицуулалт хийхгүй байх, төслийн ач холбогдол, үр ашгийг тооцож баталгаажуулж байх;
- Тайлант оны эцсийн зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг төсөвт буцаан төвлөрүүлж байх;
- Аймаг, нийслэлийн хэмжээгээр төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд бүрэн тусгасан талаархи мэдээ, тайланг аймаг, нийслэлийн төрийн сангийн газраар гаргуулан Засгийн газрын 2007 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд тусгах.

**Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ –ын дарга нарт:**

- Хөрөнгийн зарцуулалт, ажлын гүйцэтгэлд орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагаас тавих хяналтыг сайжруулах;
- Төсөл, арга хэмжээний ажлын чанар, гэрээний биелэлтийг ханган биелүүлэхэд анхаарч холбогдох байгууллагаар гүйцэтгэлийг шалгуулах;
- Гэрээт хугацаанд ашиглалтад оруулаагүй, бэлтгэн нийлүүлээгүй төсөл, арга хэмжээг дуусгах арга хэмжээ авах;
- Хууль зөрчиж ажлын гүйцэтгэгч сонгосон, хуурамч баримт үйлдэн санхүүжилт авсан байгууллага, хүмүүст хариуцлага тооцох;
- Төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд бүрэн тусгах.

## Бүс, орон нутагт зориулалтын дагуу ашиглаагүй хөрөнгийн судалгаа

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Байршил
1	Хүрмэн сумын соёл, спортын төвийн барилга	Өмнөговь Хүрмэн сумын төв
2	Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ-ын барилгын засвар	Дундговь Дэлгэрцогт сумын төв
3	Сайнцагаан сумын ЗДТГ-ын барилга	Дундговь Сайнцагаан сумын төв
4	Хулд сумын соёлын төвийн барилга	Дундговь Хулд сумын төв
5	Шинэ худаг	Баян-Өлгий Цагааннуур сум
6	Сумын хүн эмнэлгийн барилга	Увс Өлгий сум
7	Сумын соёлын төвийн барилга	Увс Зүүнхангай сум
8	Хүн эмнэлгийн барилга	Завхан Идэр
9	Мөст сумын УЦС-ын зураг төсөв	Ховд Мөст сум
10	Буянт голын ус хуваарилах байгууламж	Ховд Буянт сум
11	Дарьганга цэцэрлэг	Сүхбаатар Дарьганга сум
12	Онгон соёлын төв	Сүхбаатар Ongon сум
13	Цахилгаан дамжуулах шугам	Хэнтий Мөрөн сум
14	Халуун усны барилга	Хэнтий Мөрөн сумын төв
15	Соёлын төвийн засвар	Хэнтий Өлзийт тосгоны төв
16	Ахуйн үйлчилгээний төв	Дорнод Чойбалсан хот
17	Сумын ЗДТГ-ын байрны засвар	Дорнод Чулуунхороот сум
18	Услалтын системийн барилга байгууламжийн засвар, шинэчлэлт	Орхон Жаргалант сум
19	Хүүхдийн төлөө төвийн барилгын засвар	Архангай аймгийн төв
20	Сумдын худаг	Хөвсгөл Ренчинлхүмбэ, Хатгал сум
21	Баянбулаг сумын соёлын төвийн барилга	Баянхонгор Баянбулаг сумын төв
22	Бөмбөгөр сумын соёлын төвийн барилгын өргөтгөл	Баянхонгор Бөмбөгөр сумын төв
23	Бөмбөгөр сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар	Баянхонгор Бөмбөгөр сумын төв
24	Өлзийт сумын соёлын төвийн өргөтгөл	Баянхонгор Өлзийт сумын төв
25	111-р сургуулийн биеийн тамирын заал	Улаанбаатар
<b>НИИТ</b>		25 14.30%

Судалгааг нэгтгэн гаргасан:

Ахлах аудитор:

Л.Одгэрэл



**Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төсөл, арга хэмжээний данс бүртгэлд аваагүй  
хөрөнгийн судалгаа**

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Байршил
1	Хотын доторхи замын шинэчлэлт 2,6 км	Дархан сумын 15-р баг
2	Үерийн далан барих 800 метр	Дархан сум 6,7-р баг
3	Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ-ын барилгын засвар	Дундговь Дэлгэрцогт сумын төвд
4	Хулд сумын соёлын төвийн барилга	Дундговь Хулд сумын төвд
5	Цагдаагийн kobан системийн барилга	Төв Баян сум
6	Шинэ худаг	Баян-Өлгий Цагааннуур сум
7	Сумын хүү эмнэлгийн барилга	Үвс Өлгий сум
8	Сумын соёлын төвийн барилга	Үвс Зүүнхангай сум
9	Мөст сумын УЦС-ын зураг төсөв	Ховд Мөст сум
10	Буянт голын ус хуваарилах байгууламж	Ховд Буянт сум
11	Дарьганга цэцэрлэг	Сүхбаатар Дарьганга сум
12	Онгон соёлын төв	Сүхбаатар Онгон сум
13	Эрдэнэцагаан ЗДТГ	Сүхбаатар Эрдэнэцагаан сум
14	Цахилгаан дамжуулах шугам	Хэнтий Мөрөн сум
15	Соёлын төвийн их засвар	Хэнтий Мөрөн сумын төвд
16	Халуун усны барилга	Хэнтий Мөрөн сумын төвд
17	Соёлын төвийн засвар	Хэнтий Өлзийт тосгоны төвд
18	Соёлын төвийн засвар	Хэнтий Жаргалтхаан сумын төвд
19	Соёлын төвд нийлүүлсэн тоног төхөөрөмж	Хэнтий аймга 8 сум
20	Хүүхдийн цэцэрлэгийн засвар	Хэнтий Барх тосгон
21	Хотын гэрэлтүүлэг	Дорнод Чойбалсан хот
22	Чийрэгжүүлэлтийн талбай	Дорнод Чойбалсан хот
23	Ахуйн үйлчилгээний төв	Дорнод Чойбалсан хот
24	Сумын ЗДТГ-ын байрны засвар	Дорнод Чулуухороот сум
25	Хотын доторхи зам засвар	Дорнод Чойбалсан хот
26	Услагтын системийн барилга байгууламжийн засвар, шинэчлэлт	Орхон Жаргалант сум
27	Соёлын төвийн их засвар	Архангай Төвшрүүлэх сум
28	Сургуулийн спорт залны дээврийн засвар	Архангай Өлзийт сум
29	Худаг	Архангай аймаг Хайрхан
30	Хүүхдийн төлөө төвийн барилгын засвар	Архангай аймгийн төв
31	Сургуулийн халаалтын засвар	Архангай Хотонт сумын Өндөрсант баг
32	"С.Лхагвадорж баатрын талбай"-н засвар	Булган Булган сум
33	"Цагаан суварга"-ын засвар	Булган Булган сум
34	Сумдын худаг	Ховсгал Ренчинхуымба, Хатгал сум
35	Аймгийн ЗДТГ-ын барилгын их засвар	Өвөрхангай Арвайхээр
36	Ижнерийн шугам сүлжээний өргөтгөл	Өвөрхангай Арвайхээр
37	Баянбулаг сумын соёлын төвийн барилга	Баянхонгор Баянбулаг сумын төв
38	Бөмбөгөр сумын соёлын төвийн барилгын өргөтгөл	Баянхонгор Бөмбөгөр сумын төв
39	Бөмбөгөр сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар	Баянхонгор Бөмбөгөр сумын төв
40	Өлзийт сумын соёлын төвийн өргөтгөл	Баянхонгор Өлзийт сумын төв
41	111-р сургуулийн биеийн тамирын заал	Улаанбаатар
42	БЗД-ийн 10-р хорооны 2 усан сан	Улаанбаатар
43	БЗД -р хорооны У булангийн засвар, 11-р хорооны ЗД-ын ажлын байрны засвар	Улаанбаатар
44	БЗД-ийн 8-р хорооны цагдаагийн байрны сантехник, ЗД ажлын байрны засвар	Улаанбаатар
45	Налайх дүүргийн цагаан байруудад хэрэглээний халуун усны шугам сүлжээ	Улаанбаатар
46	ХУД 120 мянгатын 1,7.20, нэхмэлийн 12-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
47	ХУД 120 мянгатын 10,14-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
48	БХДүүрэгт худаг	Улаанбаатар
49	БХДүүрэгт нийлүүлсэн тоног төхөөрөмж	Улаанбаатар
50	ХУД 12-р хороо Биокөмбинат 38, 52-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
51	ХУД-ын 13-р хороо Туул тосгоны 3,4-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
52	ХУД-ын 10-р хороо Буянт-Ухаа 34-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
53	БГД 3-р хороо 70-р байр, 1-р хороо 010, 011-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
54	БГД 3-р хороо 69-р байр 1, 2-р орцны дээврийн засвар	Улаанбаатар
55	БГД 4-р хороо 10-р байр, 2-р хороо 2-30-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар

**Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төсөл, арга хэмжээний данс бүртгэлд аваагүй  
хөрөнгийн судалгаа**

56	БГД-ийн 1-р хороо ТЗамын музейн урд зам засвар	Улаанбаатар
57	БГД Варетогийн зүүн талын зам засвар	Улаанбаатар
58	БГД 1-р хороо 20-р сургуулийн зүүн талын зам засвар	Улаанбаатар
59	БГД 2-р хороо 7-1, 26-р байрны урд зам засвар	Улаанбаатар
60	БГД 2-р хороо 51-р байрны урд зам засвар	Улаанбаатар
61	БГД 2-р хороо 69, 70,71-р байрны хойд, 50, 53, 41, 63-р байрны арын зам засвар	Улаанбаатар
62	БГД-ийн 5, 9-р хорооны өрхийн амналагт нийлүүлсэн тоног төхөөрөмж	Улаанбаатар
63	БГД-ийн сур, цацарлагийн компьютер, түүний сүлжээ	Улаанбаатар
64	БГД 13, 14-р хороо 3-р хороолол 1, 26, 17-р байрны лифт засвар	Улаанбаатар
65	БГД 13-р хороо 3-р хороолол 2г байрны лифт засвар	Улаанбаатар
66	БГД 4-р хороолол 57, 61-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
67	БГД 4-р хороолол 51, 58-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
68	БГД 4-р хороолол 45-р байр, 3-р хороолол 236-1-р орц, 21-р байрны 2-р орчны дээврийн засвар	Улаанбаатар
69	Хорооныхоо сур, цацарлагт нийлүүлсэн компьютер, тоног төхөөрөмж	Улаанбаатар
70	СХД-ийн 1-р хороонд спорт заал барихад нэмэлт хөрөнгө	Улаанбаатар
71	СХД-ийн 2-р хорооны өрхийн амналагийн засвар	Улаанбаатар
72	СХД 1-6-р хороонд нийлүүлсэн компьютер, сандал шнрээ	Улаанбаатар
73	СХД-ийн 4, 5, 6-р хорооны өрхийн амналагт авсан машин	Улаанбаатар
74	СХД-ийн 4, 5, 6-р хорооны цагдаад авсан мотоцикл	Улаанбаатар
75	СХД-ийн 4, 5, 6-р хорооны өрхийн амналагт авсан машин	Улаанбаатар
76	СХД ХЗСАИралтын хуралэнгийн гадна цахилгааны ажил	Улаанбаатар
77	ХЗСАХуралэнгийн зам талбайн гэрэлтүүлэг сүүдрэвчийн ажил	Улаанбаатар
78	Эуны театр	Улаанбаатар
79	Хуралэнгийн үерийн хангаалалтын сүвгийн ажил	Улаанбаатар
80	СХД 1-р хороолол 8-р хороо 2-р байр 2-р орц, 11-р байр 2-р орцны дээврийн засвар	Улаанбаатар
81	СХД 1-р хороолол 13, 14-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
82	СХД 1-р хороолол 26, 27, 28-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
83	СХД 19-р хороо 1-60 айл, 20-р хороо нефтийн 2-27-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
84	СХД 19-р хороо 1, 2-р 58 айлын орон сууцны зам засварын ажил	Улаанбаатар
85	СХД 19-р хороо 2-ын 48 айлын орон сууцны зам засварын ажил	Улаанбаатар
86	СХД 18-р хороо 5-н шарын хороолол доторхи зам засварын ажил	Улаанбаатар
87	СХД-ийн гэр хорооллын айлыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил	Улаанбаатар
88	ЧД 24-р сургуулийн бие засах газрын засварын ажил	Улаанбаатар
89	ЧД 50-н мянгат 19-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
90	ЧД 6-р хороо 24, 25-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
91	ЧД 5-р хороо 2а байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
92	Хороодод нийлүүлсэн тоног төхөөрөмж	Улаанбаатар
93	ЧД 17-р хороонд гүний худаг	Улаанбаатар
94	ЧД 13-р хороо өрхийн амналаг тоног төхөөрөмж	Улаанбаатар
95	СБД 3-р хороо 2а байрны авто зам засварын ажил	Улаанбаатар
96	СБД 3-р хороо 10-р байрны зам засварын ажил	Улаанбаатар
97	СБД 4-р хороо 40, 66-р байрны зам засварын ажил	Улаанбаатар
98	СБД 4-р хороо 40, 50, 45, 42-р байрны зам засварын ажил	Улаанбаатар
99	СБД 5-р хороо 39-р байрны зам засварын ажил	Улаанбаатар
100	СБД 220 мян-тын 1-р хороо 25, 26-р байрны зам засварын ажил	Улаанбаатар
101	СБД 2-р хороо 3-р байрны зам засварын ажил	Улаанбаатар
102	СБД 220 2-р хороо Усны гудамжны 29, 26, 1а-р байрны зам засварын ажил	Улаанбаатар
103	СБД-ийн 6-р хороо 45, 8-р байрны дээврийн засвар	Улаанбаатар
104	СБД-ийн ахмадын сувиллын хашаа	Улаанбаатар
105	СБД 6-р хороо МУИС 2-р байрны арын зам засварын ажил	Улаанбаатар
106	СБД 6-р хороо залуучууд зочид буудлын баруун урд талын байрны зам засварын ажил	Улаанбаатар
107	СБД 6-р хороо 3-р байрны зам засварын ажил	Улаанбаатар
108	СБД 6-р хороо 7-р хороо 11-р хорооллын 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-р байрны зам засварын ажил	Улаанбаатар

**Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төсөл, арга хэмжээний данс бүртгэлд аваагүй  
хөрөнгийн судалгаа**

109 СБД 6-р хороо 7-р хороо 11-р хорооллын 4-н уул захын хажуу байрны зам  
засварын ажил

Улаанбаатар

## Бүс, орон нутагт дуусаагүй, хийгдээгүй төсөл, арга хэмжээ

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Байршил	Гүцэтгэгчийн нэр	Төсөв	Сангийн яамны санхүүжилт	Дуусаагүй	Хийгдээгүй
1	Далгарцогт сумын ЗДТГ-ын барилгын засвар	Дундговь Дэлгэрцогт сумын төвд	УБ харьяат иргэн С.Өлзийбаяр	30.0	30.0	1	
2	Сайнцагаан сумын ЗДТГ-ын барилга	Дундговь Сайнцагаан сумын төвд	Чандмань Ус ХХК	25.7	25.7	1	
<b>ДУНДГОВЬ АЙМАГ</b>							
				<b>55.7</b>	<b>55.7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
3	Шинээр худал барих	Баян-Өлгий Цагааннуур сум	Кэрст ХХК	20.0	20.0		1
4	Хотын цацарчлэхуулалт	Баян-Өлгий Өлгий сум	Ганбарс ХХК	20.0	16.0	1	
<b>БАЯН ӨЛГИЙ АЙМАГ</b>							
				<b>40.0</b>	<b>36.0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5	Хүн эмнэлгийн барилга шинээр барих	Завхан Идэр	Алс ХХК	55.8	50.0	1	
<b>ЗАВХАН АЙМАГ</b>							
				<b>55.8</b>	<b>50.0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
6	Мөст сумын УЦС-ын зураг төсөв боловсруулах	Ховд Мөст сум	БНХУ-ын Шинжааны Главал виста инвестмент груп	30.0	30.0	1	
7	Буянт голын ус хуваарилах байгууламж барих	Ховд Буянт сум	Шандны Булаг ХХК	49.1	48.9	1	
<b>ХОВД АЙМАГ</b>							
				<b>79.1</b>	<b>78.9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
8	Эрдэнэцагаан ЗДТГ	Сүхбаатар Эрдэнэцагаан сум	ӨМӨЗО Зүүн үзэмжин хошууны Барилга хот байгуулалтын товчоо	40.0	40.0	1	
9	Дарьганга цацролэг	Сүхбаатар Дарьганга сум	Шарга ХХК	44.1	44.1	1	

## Бус, орон нутагт дуусаагүй, хийгдээгүй төсөл, арга хэмжээ

10	Солон соёлын төв	Сүхбаатар	Олон сүм	Хурлын мод ХХК	7.7	7.7	1
<b>СҮХБААТАР АЙМАГ</b>							
11	Цэцэглэн дамжуулах сүлжээ	Халхтай	Мөрөн сүм	Баяг сүрлээ ХХК	19.1	19.1	1
12	Халуун усны барилга	Халхтай	Харлан сумын төвд	Орлон констракшн	14.0	14.0	1
13	Соёлын төвийн засвар	Халхтай	Өлзийт тосгоны төвд	Орлон констракшн	8.1	8.1	1
14	Соёлын төвд тоног тоногцоо хийгүүлэх	Халхтай	аймаг В сум	Протекс ХХК	20.2	20.2	1
<b>ХЭНТИЙ АЙМАГ</b>							
15	Ауурын үйлдвэрлэлийн төв	Дорнод	Чойбалсан хот	ДСЦ ХХК	75.0	74.9	1
16	Сумын ЗДТ-ын байрны засвар	Дорнод	Чулуунжиргал сум	ЭМЗ ХХК	27.0	27.0	1
<b>ДОРНОД АЙМАГ</b>							
					102.0	101.9	2
17	Услагын системийн барилга байгуулалтын засвар, шинэчлэлт	Орлон	Жаргалант сум	Эрдэнэт Орлон ХХК	100.0	99.0	1
<b>ОРХОН АЙМАГ</b>							
					100.0	99.0	1
18	Хуудас гаргах	Архангай	аймаг Хайрхан	Эрдэнэцэцгийн ХХК	70.0	70.0	1
19	Хүүхдийн төлөө тэвхийн барилгын засвар	Архангай	аймагийн төв	Цэцэглэн сэтгэвэр ХХК	17.9	17.9	1
<b>АРХАНГАЙ АЙМАГ</b>							
					87.9	87.9	2

## Бүс, орон нутагт дуусаагүй, хийгдээгүй төсөл, арга хэмжээ

20	"Цагаан суварга"-ын засвар	Булган, Булган сум	Авдгай трейд ХХК	40.0	40.0	1	
21	"С.Лягвадарж баатрын талбай"-н засвар	Булган, Булган сум	Булган барилга ХХК, Цоёкот ХХК	39.2	39.2	1	
<b>БУЛГАН АЙМАГ</b>						<b>2</b>	<b>0</b>
22	Сундад худал гаргах	Хөвсгөл, Ренчинхүрээ, Хатгал сум	Бн гарн ХХК	50.0	38.8	1	
<b>ХӨВСГӨЛ АЙМАГ</b>						<b>0</b>	<b>1</b>
23	Айвгийн ЗДТГ-ын барилгын нэ засвар	Өвөрхангай, Арвайхээр	Эн тэргүүн ХХК	80.0	80.0	1	
<b>ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ</b>						<b>1</b>	<b>0</b>
24	Баянбулаг сумын соёлын төвийн барилга	Баянхонгор, Баянбулаг сумын төв	Чулуун өргөө ХХК	45.0	45.0	1	
25	Бөмбөгөр сумын соёлын төвийн барилгын өргөтгөл	Баянхонгор, Бөмбөгөр сумын төв	Чулуун өргөө ХХК	25.0	25.0	1	
26	Бөмбөгөр сумын иргэдийн байрлалын засвар	Баянхонгор, Бөмбөгөр сумын төв	Ган Мөнхэн ХХК	14.4	10.0	1	
27	Өлзийт сумын соёлын төвийн өргөтгөл	Баянхонгор, Өлзийт сумын төв	Рацаагт булаг ХХК	49.0	49.0	1	
<b>БАЯНХОНГОР АЙМАГ</b>						<b>3</b>	<b>1</b>
28	111-р сургуулийн биеийн тамирчдын заал барих	Дэлгэн өрх ХХК	Дэлгэн өрх ХХК	97.1	97.1	1	
<b>БҮГД УРСУУЛЫН ХАМГААГАХ АЖААЛ</b>						<b>1</b>	<b>0</b>

Хавсралт E

Бүс, орон нутагт дуусаагүй, хийгдээгүй төсөл, арга хэмжээ

Бүсийн нэр	Бэлгэдсэн төсөв	Салгийн хэмжээг гарсан нийт самууныг	Дуусаагүй	Хийгдээгүй
ТӨВӨЙН БҮС	55.7	55.7	2	0
БАРУУН БҮС	174.8	164.9	4	1
ЗӨВН БҮС	295.2	295.1	6	3
ХАНГАЙН БҮС	530.4	505.8	9	2
УЛААНБААТАР БҮС	184.8	154.3	7	2
Орон нутгийн мэдээлүүлэх төсөл	2099.6	2099.6	1	2
<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>3300.5</b>	<b>3235.4</b>	<b>25.0</b>	<b>8.0</b>

Суралцаж ялгаван гаргасан:  
Ахлах аудитор:

Л.Одгирал

## Бүс, орон нутагт дуусаагүй, хийгдээгүй төсөл, арга хэмжээ

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ШАЛТГААН, ТАЙЛБАР
1	Дэлгэрдэт сумын ЗДТГ-ын барилгын ажлаар	2006.9.10-д гараг хийж СР 2006.10.5-д Улсын комиссын ахтар 2006.10.31-д 20.0 сая, 2006.12.4-д 2.0 сая өгрөлийг Зөвхөн өрө хөршөөд шилжүүлсэн. Барилгын хамил чуураагыг боловч, засварлаагүй, шавьг түрхэй бетоноор цугтасан, хамаат бүрэн халах боломжгүйгээс хөшлөрсөн гэж дүгнэж гаргасан Гэрээ 2006.5.10-д хийж 10.15-д дуусгав. 25.7 сая өгрөлийн ажил гүйцэтгэл, 2006.12.7-д хүлээн авсан ахтыг үндэсэн СР 2006.12.4-д 1.7 сая, 10.31-д 2-и 0 сая эрх нээж санхүүжүүлсэн, Мөнгөгүйгээс 11 дугаар сарын сүүлээр барилгын суурь тавих ажил болонгуй болсон, барилга барих газрын асуудлыг шинэчлээгүй байсангаас хөшлөрсөн
<b>ДУНДГОВЬ АЙМАГ</b>		
3	Шинээр худал барих	Гүйцэтгэлч олохгүй байснаас 2006.11.21-д гараг хийсэн. 2006.12.15-д Цэцэглэнур тосгоны захиргааны албаны 89 дугаар албан ёсны "12.15-д авсан хийсэн санхүүжилт олгоно" уу гэж бичсэн. Санхүүжилтийн 20.0 сая төгрөлийг гүйцэтгэлч "Хард" ХХК-д олгосон боловч ажил хийгдээгүй байна.
4	Холын цадраласжүүлалт	2006.9.1-д гараг хийж 11-р сарын 30-ны ЗД-ын 1011143 дугаар албан ёсны гүйцэтгэлийг СР-д зуржүүлсэн. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төлөөлөгчид ажил дутуу хийгдсэн байхад үү ажилд зориулсан хөрөнгөөс айлганы. Засаг даргын шийдвэрээр Хол голжуулах албад 2,1 сая төгрөг олгогдов.
<b>БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ</b>		
5	Хүү амлалтын барилга шинээр барих	Гэрээг 2006.10.22-д хийсэн, 2007.8.15-д ашиглагда өгн гэсэн боловч Идрэ сумын ЗД-ын 275 албан ёсны 2006.12.19-д дууссан санхүүжилт олгоно уу гэсэн байна.СР 2006.11.20-д 40.0 сая, 2006.12.25-д 10.0 сая төгрөлийг гүйцэтгэлийн барилгасар эрх нээж санхүүжүүлсэн. 2007 оны 4 дугаар сард эзэлсэн амлалтын бүтээлийн ажил суурь хийгдээж, хана 1.5 метр өргөрсөд материал байжгүйгээс эгссэв. Гэвч 2008 олд хийгдээгүй ажилд урьдчилгаа 50.0 сая төгрөлийг урсгал төсвөөс олгосон байна.
<b>ЗАВХАН АЙМАГ</b>		
6	Мөст сумын ҮГЦ-ийн зурга төсөл боловсруулах	2006.12.20-д гараг хийж 2006.12.25-д дуусгалаа гэсэн. 2006.11.14-д төлөөр зарласан.Хүлээн авсан ахт ажлын комиссын ахтыг 2006.12.25-д хийж СР 30.0 сая эрх нээж санхүүжүүлсэн.
7	Бүжиг голын ус хуваарилгах байгууламж барих	2006.7.1-д гараг хийж 2006.11.1-д дуусгалаа гэсэн 48.9 сая төгрөлийн ажил гүйцэтгэл гарган СР 2006.8.24-д 15.0 сая, 2006.10.10-д 20.4 сая, 2006.12.15-д 13.5 сая төгрөлийг эрх нээсэн. Ажлын комисс ахт 2006.11.20 № 11 дугаар гэсэн.
<b>ХОВД АЙМАГ</b>		
8	Эрдэнэцагаан ЗДТГ	Гэрээг 2006.8.21-д хийсэн 2006.10.20-д дуусгалаа СР 2006.9.10-ны гүйцэтгэлээр 2006.10.31-д 35.0 сая, 2006.12.4-д 5.0 сая эрх нээж санхүүжүүлсэн. Барилга ашиглагда өрсөн боловч Улсын комиссын алтаар х үлэвэрсээгүй.
9	Дарьинга цэцэрлэг	Гэрээг 2006.8.21-д хийсэн. 2006.9.1-11.15-д дуусгалаа гэсэн 2006.12.13-ны 18-р ахтар урсгал комисс авсан гэсэн тул СР 2006.9.28-д 15.9 сая, 2006.11.16-д 11.0 сая,2006.12.29-д 17.2 сая төг эрх нээж санхүүжүүлсэн, барилгын ажил он дамжин хэрэгжээж байна





## Бүс, орон нутагт дуусаагүй, хийгдээгүй төсөл, арга хэмжээ

20	"Цэцэн суваг" -ийг засвар	Төсөд зарлаагүй гүйцэтгэлийг солих гэрээг 2006.4.30-д байгуулсан, 2006.12.31-д дуусгана. СЯ 2006.9.13-д 30.0 сая, 2006.12.22-д 10.0 сая-и 2006.10.20-ны үе шатны ажил хүртэлхэд авт. айлын ЗД-ийг 2006.12.14-ны 011/1230 дугаар агаарын бичгээр эрх нээж самууруулсан. төслийг шилжсэн хийсэн барилтгүй. БУА-ын үе шатны ажил хийгдээг өндөр мөргөлдөөр хэдий хэмжээний ажил хийсэн нь тодоройгүй, барилгын ажил зургайг өөрчлөсөн, захиалагч барилгын шаард. хяналт тавьж ажлаагүй зэрэг шалгалтын улмаас сувагдга болгох ажил дуусаагүй.
21	"С.Лувддорж баатрын талбай"-н засвар	Гэрээг 2006.4.25-д хийсэн. 2006.6.17-5-д дуусгана.2006.9.15-ны улсын комиссын агаар СЯ 2006.9.29-д 9.2 сая, 2006.9.13-д 30.0 сая эрх нээсэн. зөвхөн хугацаанд ажил дуусаагүй шалтгаан нь самууруулт хугацаа хоёрч 9 дугаар сарын 25-д хийдрнээс өмнө, өмнөх хугацаанд засварын ажил хийгдэх боломжгүй болсонтой холбоотой
<b>БУЛГАН АЙМАГ</b>		
22	Сундад худал гаргах	2006.9.25-д гэрээ хийсэн 2006.11.10-д дуусгана. СЯ 19.2 сая, 21.6 сая төгрөгийн нийт 39.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэлээр 2006.10.27-д эрх нээж самууруулсан. Рачево-Убара сумын төвийн газрын хөрөнгийг тусгай Цагад судлалын хүрээлэнгийн судалгаагаар 150-300 метрийн гүн, цацдагтай нь тогтоосон тул хүн өрөөлдөхөд худал гаргах боломжгүй дүгнэлтэд хүрч сумын төвөөс 5 км-т орших Цэцэн булганаас үс дайруулах хөдөлгөөнтэй тэгэн үндэн усны хэрэгээр хангах нь зүйтэй гэж үзэн усан сан барих зурга төсвийг хийлгэсэн байна. Гэвч тус суманд худал гаргах үс дайруулах хөдөлгөөн уран сан байгуулах ажлын аль нь ч өндөрлөхгүй хүртэл хийгдээгүй байна. "Бн Гари" ХХК-д гэрээний дүгнүү хүртлийн ажлын төслийн 30 хувийг урьдчилгаанд самууруулах агаар нийт төслийн 60 хувь буюу 30.0 сая төгрөгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр шалгуулсан байв. Уг самууруулгаас "Батсүрэй" ХХК-ийн захирал Л.Баянцагайд тус дугаар 7.0 сая төгрөг өснийг агуулсан нөхцөл бүрдэн тодруулсан.
<b>Хөвсгөл аймаг</b>		
23	Айлийн ЗДТГ-ийг барилгын тг засвар	Гэрээг 2006.7.17-д гэрээ хийж 2006.8.11-д дуусгана.Улсын комиссын агаар 2006.12.12 өдөрхөд 23.05 хүртэлх агаар. СЯ 2006.12.18-ны 1.2 сая, 2006.9.6-ны 22.6 сая, 2006.8.4-ны 66.0 сая, нийт 66.8 сая төгрөгийн эрх нээж самууруулсан.
<b>Өвөрхангай аймаг</b>		
24	Банкбулаг сумын соёлын төвийн барилга	Гэрээг 2006.11.14-д хийж 12.15-д дуусгана. 41.9 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэл, 2006.12.10-д ажил хүрэн авсан агаар СЯ 2006.12.20-д 42.0 сая, 12.25-д 2.9 сая төгрөгийн эрх нээж самууруулсан. Самууруулт өрсөлтөөс гэрээг хугацаанд гүйцэтгэх боломжгүй болсноос ажил эхлээгүй
25	Баянбөгөр сумын соёлын төвийн барилгын өргөтгөл	<b>Гэрээг 2006.8.15-д хийж 10.20-д дуусгана. 10.16-ны ажил хүртэлхэд агаар СЯ 2006.10.20-д 20.0 сая, 11.14-д 977.0 нөхцөл өргөлийн эрх нээж, Баянбөгөр сумын Соёлын төвийн барилгын засвар гэж төсөвт багтаасан боловч шинээр барьж байгаа барилга байна</b>
26	Баянбөгөр сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар	Гэрээг 2006.8.14-д хийж 9.25-д дуусгана. СЯ 2006.Ажил гүйцэтгэлийг үндсэн СЯ 2006.11.1-д 10.0 сая, Баянбөгөр сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар нь сургуулийн ашиглааагүй байсан хуучин дотуур байр засварлаж байгаагай холбоотой байна
27	Өлзийт сумын соёлын төвийн өргөтгөл	Гэрээг 2006.10.1-д хийж 9.10-10.1-д дуусга. Ажил акт, гүйцэтгэлээр СЯ 2006.11.23-д 20.0 сая, 12.26-д 5.0 сая, 10.23-д 24.0 сая төгрөгийг самууруулсан. Өмнөхт сумын Соёлын төвийн өргөтгөл гэжээ болон Ажуй үйлчилгээний төвийн хуучин цементэн сүүрэн дээр шинээр барьж байгаагай холбоотой байна
<b>Баянхонгор аймаг</b>		
28	111-р сургуулийн биеийн тамирын зааг барих	Гэрээг 2006.11.21-д хийсэн 2007.7.1-д дуусна. СЯ гүйцэтгэлийг үндсэн 2006.12.5-ны 29.0 сая, 2006.12.19-ны 68.1 сая нийт 97.1 сая төгрөгийн эрх нээжээ.
<b>БТ-Р ТОМРОГ БАЯНЗҮРХ</b>		

## Бүс, орон нутагт дуусаагүй, хийгдээгүй төсөл, арга хэмжээ

29	СХД-ийн 1-р хороонд өсөрт зориулж барихад зориулж хөрөнгө	Гэрээг 2006.10.5-д хийсэн 2007.4.27-д дуусна. СЯ 2006.12.16-ны 15.0 сая, 2006.12.13-ны 20.0 сая, 2006.12.18-д 15.0 сая нийт 35.0 сая төрлийн түүн-р эрх үзэсгэлэн.
<b>67-Р ТОЙРОГ СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ</b>		
30	ХЗСА Хураалгийнхэн дам талийн гэрлүүлэг сүүдэрлэлийн ажилд	Гэрээг 2006.8.18-д хийсэн 2006.10.18-д дуусна.СЯ 2006.12.18-д нийт 52.0 сая эрх
31	Зуны тээвэр барихад	Гэрээг 2006.9.29-д хийсэн. 2006.11.01-д дуусна.СЯ 2006.12.25.7.5 сая эрх
32	Хүрээлэнгийн үндэсний хяналгалтын сүлжийн ажилд	Гэрээг 2006.8.18-д хийсэн 2006.10.18-д дуусна. Бүгдийг хүлээн авсан Улсын комиссын акт 2006.12.22-д гарсан
33	СХД ХЗСА-рхаттын хүрээлэнгийн гадна цогцлоомын ажилд	Гэрээг 2006.8.18-д хийсэн 2006.10.18-д дуусна.СЯ 2006.12.20-д 7.0 сая, 2006.12.25-д 29.9 сая эрх
<b>68-Р ТОЙРОГ СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ</b>		
34	СБД 220 мянгийн 1-р хороо 25, 26-р байрны зам засварын ажил	Гэрээг 2006.8.1-д хийсэн 2006.8.18-9.25-д дуусна. СЯ 2006.10.17-д нийт 29.3 сая эрх үзэсгэлэн.
35	СБД 2-р хороо 3-р байрны зам засварын ажил	Гэрээг 2006.8.18-д хийсэн 2006.9.25-д дуусна.
36	СБД 220 2-р хороо Усны Гудамжны 25, 26, 1а-р байрны зам засварын ажил	Гэрээг 2006.8.18-д хийсэн 2006.9.25-д дуусна.
<b>74-Р ТОЙРОГ СУХБААТАР ДҮҮРЭГ</b>		
37	Орон нутгийг мэдрэгдэлжүүлэх төсөл	Гэрээг 2006.8.1-д Сансар ноёны, ХХК-тай МХХТ-гаар,СЯ хийсэн. 45 хөнгөлийн дотор мийнэ. 2006.11.27-д МКС ХХК, МЦХ ХХК-тай г 2006.12.29-д дуусна. галгараа хийсэн.
29-й-37		<b>БҮХ АЙМАГТ</b>

Суралцаж нэлсэн гаргасан:  
Ахлах яргалжигч:

Л.Одгирал

**Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр 2006 онд олгосон хөрөнгийн зарцуулалтад аудит хийх явцад илэрсэн төлбөр, зөрчлийн жагсаалт**

сая.төг

Д/Д	Аудитын байгууллагын нэр	Акт		Албан шаардлага		Зөрчлийн утга	Барагдуулах байгууллага
		тоо	дүн	тоо	дүн		
1	Булган						
		1	85.8			Хангалын голын босмын барилгын гүйцэтгэгч Эрдэнэт-Оргил ХХК нь тендерийн гэрээт хугацаанд ажлаа гүйцэтгээгүй, урьдчилгаа санхүүжилтийг хууль бусаар олгосон	Эрдэнэт-Оргил ХХК
2	Орхон			1	18.3	Төсвийн хөрөнгө оруулалтын үлдэгдэл хөрөнгийг орон нутгийн төсөвт хууль бусаар төвлөрүүлсэн	Аймгийн санхүү эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга, төрийн сангийн ерөнхий нягтлан бодогч
				1	14.0	Хөрөнгө оруулалтаар бэлтгэсэн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаагүй	Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч
3	Төв			1	51.1	Барилга, машин тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглагч байгууллагын санхүүгийн тайлан тэнцэл, хөрөнгийн данс, бүртгэлд тусган аваагүй	Аймгийн цагдаагийн газрын дарга, ахлах нягтлан бодогч
4	Говь-Алтай						
5	Дархан-Уул						
6	Сэлэнгэ						
		3	1.1			Байгууллага, төсвийн орлого болгох тухай	"Авга ач нар" ХХК, Ц.Оюунцэцэг, Д.Пүрэвсүрэн, Ж.Батсайхан
7	Ховд			2	8.7	Хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаж аваагүй, ажлын гүйцэтгэлийн тайлан байхгүй, төсвийн хэтрүүлэн зарцуулсан, АШБ-ын бүрдэлт хангалтгүй	Аймгийн санхүү эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, "Авга ач нар" ХХК
8	Увс						
9	Хөвсгөл	1	7.0			Зориулалтын бус зүйлд зарцуулсан	Батсарай ХХК
10	Дундговь						
11	Дорноговь						
12	Говьсүмбэр						
13	Баянхонгор			1	4.7	НӨАТ-ыг төсөвт шилжүүлээгүй, санхүүжилтийг илүү олгосон	Аймгийн СЭЗБЗХ, Аймгийн төрийн сан
14	Өмнөговь						
15	Архангай			1	17.8	Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй	Цагаан сүмбэр ХХК
16	Дорнод			1	74.9	Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй	Аймгийн үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, байгаль орчны бодлого зохицуулалтын хэлтэс
18	Завхан						
19	Сүхбаатар						
		1	0.9			НӨАТ-ыг дутуу ногдуулсан	Кектас ХХК
20	Баян-Өлгий			2	22.1	Төсвийг үр ашиггүй зориулалтын бус зүйлд зарцуулсан	Аймгийн төрийн сан
21	Хэнтий						
	<b>Орон нутгийн дүн</b>	<b>6</b>	<b>94.8</b>	<b>10</b>	<b>211.6</b>		
22	Улаанбаатар хот						
				2	3641.2	зарцуулаагүй үлдэгдэл, дуусаагүй, хийгээгүй ажил	Сангийн яамны Төрийн сангийн газар, Шадар сайдын ажлын алба
23	ҮАГ						
	<b>Нийт дүн</b>	<b>6</b>	<b>95</b>	<b>12</b>	<b>3852.8</b>		
	Жагсаалтыг нэгтгэсэн:						
	Ахлах аудитор					Л.Одгэрэл	~

**Бүс, орон нутгийн хөгжилд зориулж зарцуулсан хөрөнгийн судалгаа**

Бүсийн нэр	Төсөл, арга хэмжээний тоо	Зарцуулалтын төрөл	УИХ-ийн гишүүний тоо	Баллалсан төсөл	Нийт санхүүжүүлсэн дүн	Сая. Төг	
						Санхүүжүүлэхүй буюу зарцуулаагүй үлдэгдэл	Аймаг, нийслэлийн төрийн санц үлдсэн
Төв бүс	Шөвө Борилга			448.7	445.1		3.6
	Борилга засвар			501.7	500.5		1.2
	хуралдан авсан үлдсэн хөрөнгө			40.9	40.9		0.1
	<b>20</b>	<b>Дүн</b>	<b>17</b>	<b>991.3</b>	<b>986.4</b>	<b>0</b>	<b>4.9</b>
Баруун бүс	Шөвө Борилга			427.7	393.2	18	11.5
	Борилга засвар			396.0	393.7	0	2.3
	хуралдан авсан үлдсэн хөрөнгө			83.0	83		
	<b>30</b>	<b>Дүн</b>	<b>14</b>	<b>906.7</b>	<b>874.9</b>	<b>18.0</b>	<b>13.8</b>
Зүүн бүс	Шөвө Борилга			103.1	108		0.1
	Борилга засвар			367.4	356.2		1.2
	хуралдан авсан үлдсэн хөрөнгө			43.2	43.2		
	<b>21</b>	<b>Дүн</b>	<b>8</b>	<b>508.7</b>	<b>507.4</b>	<b>0</b>	<b>1.3</b>
Хангай бүс	Шөвө Борилга			457.3	442.2	0.1	15.2
	Борилга засвар			574.6	529.4	28.8	16.4
	хуралдан авсан үлдсэн хөрөнгө			169.0	169	0	0
	<b>30</b>	<b>Дүн</b>	<b>18</b>	<b>1200.9</b>	<b>1140.6</b>	<b>28.7</b>	<b>31.6</b>
Улаанбаатар	Шөвө Борилга			512.6	403.0	86.1	10.7
	Борилга засвар			910.9	773.4	50.2	87.3
	хуралдан авсан үлдсэн хөрөнгө			469.1	489.8	0	-0.7
	<b>73</b>	<b>Дүн</b>	<b>19</b>	<b>1892.8</b>	<b>1646.2</b>	<b>149.3</b>	<b>97.3</b>
Бүх аймаг	Орон нутгийг мэдээлжүүлэх төсөл			2099.6	2099.6		0.0
	Шөвө Борилга			1954.6	1796.5		
	Борилга засвар			2740.6	2553.2		
	<b>175</b>	<b>Нийт дүн</b>	<b>76</b>	<b>7600.0</b>	<b>7255.1</b>	<b>196.0</b>	<b>148.9</b>

Судалгааг нэгтгэн багтгэсэн:

Ахлах аудитор

Л.Одгэрал



Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төсөл, арга хэмжээний судалгаа

ХАРИУЛТ	Төсөл, арга хэмжээний нэр	ХЭМЖЭЭ	Төсөв зарласан эвэх		Гүйцэтгэлийн тоо	Гүйцэтгэлийн хэрэглэл (Улаанбаатарын)	Гүйцэтгэлийн соёлын эвэх	Гэрээний хугацаанд ашиглагдаж өссөн эвэх	Гэрээний хугацаа хетэрээж хонор		
			АНХны арга хэлбэр бүрээр	Хувь хүн							
	Төв бүс	хувь	85%	5%	20	11	55%	10%	10	50%	12-180
		лооо	19	1							
	Баруун бүс	хувь	100%		29	2	6.9%		21	70%	3-170
		лооо	30								
	Зүүн бүс	хувь	66.7%		19	5	26.3%	4.8%	10	47.6%	60-180
		лооо	14								
	Хангайн бүс	хувь	86.7%		26	11	42.3%	13.3%	11	36.7%	32-240
		лооо	26								
	Улаанбаатар бүс	хувь	85.2%		57	57	100%	5.7%	60	82.2%	60-270
		лооо	41								
	Орон нутгийг илэрхийлэх тусгал	хувь	100%		1	1	100%				
		лооо	1								
	<b>Нийт дүн</b>	хувь	74.9%	0%	152	87	57.2%	6.3%	112	64.0%	3-270
		лооо	131	1							
	Төв	хувь		8%		9	45%	80%	10	50%	
		лооо	1								
	Баруун бүс	хувь				27	83.1%	100.0%	9	30%	
		лооо									
	Зүүн бүс	хувь		33.3%		14	73.7%	95.2%	11	52.4%	
		лооо	7								
	Хангайн бүс	хувь		13.3%		15	87.7%	86.7%	19	63.3%	
		лооо	4								
	Улаанбаатар бүс	хувь		43.8%		0	0%	94.3%	13	17.8%	
		лооо	32								
	Орон нутгийг илэрхийлэх тусгал	хувь							1	100%	
		лооо									
	<b>Нийт дүн</b>	хувь	25.1%	0%		65	42.8%	93.7%	63	36.0%	
		лооо	44	0							

Судалгааг нэгтгэн бэлтгэсэн: Ахлах аудитор

Л.Одгэрал

Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төсөл, арга хэмжээний судалгаа

ХАРИУЛТ	БҮСИЙН НЭР	ХЭМЖЭЭ	Уг ажил орон нутгийн ахуйн төлөвлөгөөтэй уялдаж байгаа эсэх		Одоо ямар байгууллагын данс бүртгэлд байгаа		Одоо зориулалтаар ашиглагдаж байгаа эсэх		Орон нутгийн иргэд дамжж буй эсэх	Орон нутгийн төр захиргааны байгууллага дамжж буй эсэх	Орон нутгийн хяналтын байгууллага шалтсан эсэх	
			хувь	тоо	хувь	тоо	хувь	тоо				
ТИЙМ	Төв бүс	хувь	100%	20	75%	15	80.0%	16	20	100%	12	60.0%
	Баруун бүс	хувь	100%	30	83.3%	25	80%	24	29	96.7%	17	56.7%
	Зүүн бүс	хувь	71%	15	28.6%	6	66.7%	14	21	100%	5	23.8%
	Хангайн бүс	хувь	100%	30	50%	15	76.6%	23	29	96.7%	30	33.3%
	Улаанбаатар бүс	хувь	100%	73	1.4%	1	98.6%	72	73	100%	73	0%
	Орон нутгийг мэдээлжүүлэх төсөл	хувь	100%	1		1	100%	1	1	100%	1	100%
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>хувь</b>	<b>96.6%</b>	<b>169</b>	<b>35.4%</b>	<b>62</b>	<b>85.7%</b>	<b>150</b>	<b>173</b>	<b>98.9%</b>	<b>175</b>	<b>25.1%</b>
	<b>Төв бүс</b>	<b>хувь</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>	<b>25%</b>	<b>5</b>	<b>20%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>40%</b>
	<b>Баруун бүс</b>	<b>хувь</b>	<b>100%</b>	<b>30</b>	<b>16.7%</b>	<b>5</b>	<b>20%</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3.3%</b>	<b>13</b>	<b>43.3%</b>
	<b>Зүүн бүс</b>	<b>хувь</b>	<b>28.6%</b>	<b>6</b>	<b>71.4%</b>	<b>15</b>	<b>33.3%</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>76.2%</b>	
ҮГҮЙ	Хангайн бүс	хувь	100%	15	50%	7	23.4%	7	1	3.3%	20	66.7%
	Улаанбаатар бүс	хувь	100%	72	98.6%	1	1.4%	1	1	100%	73	100%
	Орон нутгийг мэдээлжүүлэх төсөл	хувь	100%	1	100%	1	100%	1	1	100%	1	100%
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>хувь</b>	<b>3.4%</b>	<b>6</b>	<b>64.6%</b>	<b>113</b>	<b>14.3%</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>74.9%</b>

Судалгааг нэгтгэн бэлтгэсэн: Ахлах аудитор

Л.Одгэрэл





МОНГОЛ УЛСЫН  
ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН ТУШААЛ

2007 оны 11 сарын 19 өдөр

Дугаар 26

Улаанбаатар хот

Аудитын тайланг баталгаажуулах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 13.4.5, "Гүйцэтгэлийн шалгалтын журам"-ын 23.2, "Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг хянан баталгаажуулах журам"-ын 4.2-т заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг.Бүс, орон нутгийн хөгжилд зориулж 2006 оны төсвөөс олгосон хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн, орон нутгийн оролцоог шалгасан гүйцэтгэлийн аудитын тайланг баталсугай.

Хоёр.Аудитын тайланг УИХ-ын Эдийн засгийн Байнгын хороо, Шадар сайдын ажлын алба, Сангийн яаманд хүргүүлсүгэй.

Гурав.Аудитын тайлангийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч, түүний үр дүнг 2008 оны 3 дугаар сарын 15-ны дотор Үндэсний аудитын газарт танилцуулахыг Шадар сайд М.Энхсайхан, Сангийн сайд Н.Баяртсайхан нарт зөвлөсүгэй.

Дөрөв.Аудитын тайланд тусгагдсан зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үндэсний аудитын газрын Нэгдүгээр газрын захирал Д.Ганбилэг, Аймаг, нийслэлийн аудитын газрын дарга нарт даалгасугай.



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЕРӨНХИЙ АУДИТОР

Л.ЖАВЗМАА
