



## ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

# ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

Аудитын код: ӨВА-2026/05-14-ШТА-НА

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ЗАРИМ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ НЬ ТӨСӨВЛӨЛТИЙН ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙГЭЭС ШАЛТГААЛЖ ТӨЛӨВЛӨСӨН ХУГАЦААНД АШИГЛАЛТАД ОРООГҮЙ БАЙНА

## УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой  
нэмэлт мэдээллийг дараах хаягаар авна  
уу. Цахим хуудас: [www.audit.mn](http://www.audit.mn)





# УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН



Аудитын дүн: АУДИТААР НИЙТ 7,800.7 СЯА ТӨГРӨГИЙН ЗӨРЧИЛ ИЛЭРЧ 6 АЛБАН  
ШААРДЛАГА, 3 ЗӨВЛӨМЖ, 7,063.9 СЯА ТӨГРӨГИЙН САНХҮҮГИЙН ҮР ӨГӨӨЖ ТООЦОВ

АЛБАН ШААРДЛАГА - 6

ЗӨВЛӨМЖ - 3

ҮР ӨГӨӨЖ - 7,063.9 сая

## ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ




Өвөрхангай аймагт 315,957.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 31 төсөл арга хэмжээ баталсан байна


Үүнээс 89,744.3 сая төгрөгийн 20 төсөл, арга хэмжээ нь өмнөх оноос шилжиж ирсэн байна



Эрх шилжиж ирсэн TAX-20 /ТЭЗ/

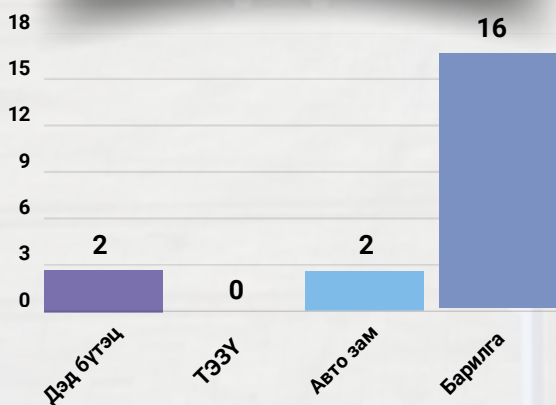

Эрх шилжиж ирээгүй TAX-11 /ТЭЗ/

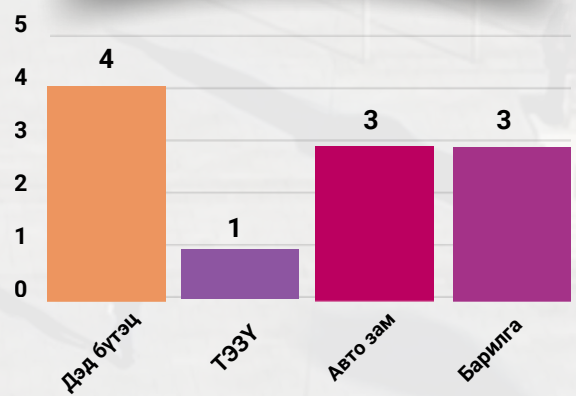



# УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

## БҮЛЭГ 1



**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ 2025 ОНД ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ШИНЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААС ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ БАЙХГҮЙ БАЙНА.**



Өвөрхангай аймагт 2025 онд 315,957.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 31 төсөл арга хэмжээ баталсан байна

Эрх шилжиж ирээгүй 226,212.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 11 төсөл, арга хэмжээ байна.



Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжүүлэхээр 483,597.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 100 төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг холбогдох яамдад хүргүүлсэн байна.



Үүнээс 5,260.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, тайлант онд 1,386.5 сая төгрөгөөр санхүүжигдэх 1 төсөл, арга хэмжээ батлагдсан ба аймгийн Засаг даргад эрх шилжээгүй байна.



Аймгийн Засаг даргаас хүргүүлсэн саналын 1.0 хувьтай тэнцэх төсөл, арга хэмжээг улсын төсвийн хөрөнгийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж байгаа нь аймаг, орон нутгийн нэн тэргүүний хэрэгцээ шаардлага, нийгэмд үзүүлэх эдийн засгийн үр дүнг бууруулж байна.

## БҮЛЭГ 2



**ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААС ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД 2025 ОНД ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЭРХИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭЭГҮЙ ТУЛ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛААГҮЙ БАЙНА**

Шинээр хэрэгжих, эрх шилжиж ирээгүй TAX - 5



Аймгийн Засаг даргад шинээр хэрэгжих, эрх шилжсэн TAX - 0

Төсөвт өртөг  
38,502.2  
сая



Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулаагүй байна.





# УЛСЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

## БҮЛЭГ 3



**УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ТӨСӨВЛӨЛТИЙН ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ БАТАЛСНААС ЗАРИМ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ ТӨЛӨВЛӨСӨН ХУГАЦААНД АШИГЛАЛТАД ОРООГҮЙ БАЙНА**

Өмнөх оноос эрх шилжин хэрэгжиж байгаа 20 төсөл, арга хэмжээнд 89,744.3 сая төгрөгийг төлөвлөжээ

Үүнээс 18,634.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 6 төсөл, арга хэмжээг 2025 онд хэрэгжүүлж дуусгахаар баталсан байна.



Улсын төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний тухайн жилд төлөвлөсөн санхүүжилт 85.7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.



Тайлант онд ашиглалтад хүлээн авсан барилга байгууламж-11 Төсөвт өртөг 34,645.2 сая төгрөг



Төлөвлөсөн хугацаанд хэрэгжээгүй TAX-3 Төсөвт өртөг 10,861.2 сая төгрөг



Төсөвт өртөг нэмэгдсэн TAX-11 Нэмэгдсэн төсөв 10,020.2 сая төгрөг

### АУДИТЫН ИЛРҮҮЛЭЛТ

#### Зөрчил

Санхүүжилт бодит гүйцэтгэлээс илүү олгогдсон

**TAX-2**  
261.9 сая

#### Зөрчил

Төсөвт тусгагдсан ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн

**TAX-2**  
63.0 сая

#### Зөрчил

Үүрэг даалгаврын биелэлт бүрэн хэрэгжээгүй ашиглалтад хүлээн авсан

**TAX-10**  
807.6 сая

#### Зөрчил

Дуусаагүй барилга дансанд дутуу бүртгэсэн

**TAX-1**  
1,726.5 сая

#### Зөрчил

Нягтлан бодох бүртгэлд зөрүүтэй бүртгэсэн

**TAX-1**  
736.8 сая

#### Зөрчил

Дуусаагүй барилга, байгууламжид үйл ажиллагаа явуулсан

**TAX-1**  
4,261.6 сая

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн зарим төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг нь нэмэгдсэнээс шалтгаалж гэрээний хугацаанд дуусаагүй байна.

Барилгын материал, хийц, бүтээцийн эрүүл ахуйн шаардлагыг лабораторийн шинжилгээ, дүгнэлтээр баталгаажуулж, хяналт хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлсэн төсөл, арга хэмжээнүүд хэрэгжсэнээр төлөвлөсөн бодлогын зорилтот үр дүнд хүрсэн байна.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн зарим төсөл, арга хэмжээг зохиогчийн зөвшөөрөлгүй зураг төсөлд өөрчлөлт оруулж гүйцэтгэсэн байна.

Авто замын ажлын хувьд захиалагч болон зохиогчийн хяналтын гэрээ байгуулаагүй нь авто зам, замын байгууламжийн ажил чанаргүй хийгдэх эрсдэлтэй байна.

Зарим салбарын хувьд төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, зорилтот түвшин, хүрэх үр дүнг чанарын шалгуур үзүүлэлтээр хэмжигдэхүйц, тодорхой байдлаар тусгах шаардлагатай байна.



## АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

**Аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйлд тулгуурлан дараах дүгнэлт хийж байна. Үүнд:**



Өвөрхангай аймгийн Засаг даргаас хүргүүлсэн саналын 1.0 хувьтай тэнцэх төсөл, арга хэмжээг Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр баталсан нь аймаг, орон нутгийн нэн тэргүүний хэрэгцээ шаардлага, нийгэмд үзүүлэх эдийн засгийн үр дүнтэй төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжийг бууруулсан байна.



Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд хэрэгжиж эхэлсэн 11 төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэлд 2025 онд хийсэн нийцлийн аудитын дүгнэлтээр төсөл, захиалагчаас ирүүлсэн төсвийн өөрчлөлтийн 10,020.2 сая төгрөгийг үндэслэлтэй гэж үзэн баталгаажуулж нэмэгдүүлсэн байна.



Төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүй төсөл, арга хэмжээг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгаснаар хуульд баталсан төсөвт өртөг нэмэгдэж, улмаар төслийг гэрээний хугацаанд хэрэгжүүлэх боломж хязгаарлагдах, үр дүн саатах, гэрээний үүргийн биелэлт алдагдах, нөөцийн ашиглалтын үр ашиг буурах эрсдэл бий болсон байна.



Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй зарим төсөл, арга хэмжээнд баримтлах хууль, журам, норм, дүрмийн шаардлагыг зөрчиж, гүйцэтгэл нь бүрэн хийгдээгүй ажлыг баталгаажуулан санхүүжилтийг илүү олгосон байна.



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлээгүй, гэрээнд заасан ажлыг 100.0 хувь гүйцэтгээгүй байхад комиссын дүгнэлт гарган барилга, байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авсан байна.



Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах улсын комисс ажиллаагүй, барилга ашиглах шийдвэр гаргаагүй, ашиглалтын гэрчилгээ олгогдоогүй, дуусаагүй барилга байгууламжид ашиглагч байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна.



Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дуусаагүй үйлдвэрлэл дансанд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ төсөл арга хэмжээг 1,726.5 сая төгрөгөөр дутуу бүртгэсэн байна.



Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дуусаагүй үйлдвэрлэл дансанд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ төсөл арга хэмжээг 1,726.5 сая төгрөгөөр дутуу бүртгэсэн байна.
