



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГЭЭС



Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөтэй уялдаж байгаа ч хууль, журамд заасан зарим шаардлага хангаагүй 118,441.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 26 төсөл, арга хэмжээг баталсан, 41,706.5 сая төгрөгийн 8 төсөл, арга хэмжээ гэрээний хугацаанд бүрэн хэрэгжээгүй байна.

Аудитын ерөнхий дүгнэлтээс, 2025 он

ГАРЧИГ

“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТ

- Хөрөнгө оруулалт
- Худалдан авах ажиллагаа
- Санхүүжилт
- Аудитын зөвлөмж
- Үндэсний аудитын газрын нэгтгэл тайланд тусгуулах санал



УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Хаяг: Увс аймаг, Улаангом сум, ЗДТГ-ын байр

Утас: 70453799

Цахим шуудан: Uvs@audit.gov.mn

<https://audit.mn/>



“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТ

Увс аймагт 2024 оны төсвийн тухай хуулиар 212,286.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 55 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталсан.



2024 онд олгох санхүүжилт нь 68,761.3 сая төгрөг байна.

Эрчим хүчний сайдын багцаас эрх шилжүүлсэн 4,505.6 сая төгрөгийн 11 төсөл, арга хэмжээ байна.



1. Гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй хүчдэлийн уналттай айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж /Ховд сум 1,2 баг /
2. Гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй хүчдэлийн уналттай айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж /Увс, Улаангом сум/
3. Сумдын цахилгаан хангамжийн шинэчлэл, өргөтгөл /Увс, Тариалан сум, Хархираа баг/
4. Сумдын цахилгаан хангамжийн шинэчлэл, өргөтгөл /Увс, Тэс сум/
5. Улаангом сумын 8-р цэцэрлэгийн дулааны шугамын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум/
6. Тэс сумын халаалтын зуухны засвар шинэчлэл /Увс, Тэс сум/
7. Эрчим хүчний тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл худалдан авах /Увс, Улаангом сум/
8. Ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх, худалдан авах /Увс, Улаангом сум/
9. Гэр хорооллын дундах гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, засвар шинэчлэлтийн сэлбэг материал худалдан авах /Увс, Улаангом сум 10-р баг/
10. Гэр хорооллын дундах гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, засвар шинэчлэлтийн сэлбэг материал худалдан авах /Увс, Улаангом сум 12-р баг/
11. Гэр хорооллын дундах гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, засвар шинэчлэлтийн сэлбэг материал худалдан авах /Увс, Өлгий сум/



“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөтэй уялдуулж төлөвлөсөн байна.

“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа”

Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр



Увс аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Увс аймгийн 2024 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг аргачлалын дагуу үнэлж эрэмбэлсэн ч эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдлыг тооцоогүй 3 төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөн байна.

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Ашиглалтын байдал
1	XVI.1.14	Загвар хоршоод, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих барилга /Увс/	Тоног төхөөрөмжтэй өрөөнүүдийг 4 жилийн хугацаатайгаар, зарим сул өрөөнүүдийг 1 жилийн хугацаатайгаар түрээслүүлэн, үлдсэн өрөөнд сонгон шалгаруулалт зарлахаар бэлтгэж байна.
2	XVI.3.15	Загвар хоршоод, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих барилгын тоног төхөөрөмж /Увс/	4 жилийн хугацаатайгаар түрээслүүлэхээр гэрээ байгуулсан ч цахилгааны холболт хийгдээгүйгээс ашиглаж эхлээгүй байна
3	XVI.3.1	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Увс/ Багц 2: Зөөлөн оёдлын тоног төхөөрөмж иж бүрдэл	Тоног төхөөрөмж, материалыг ашиглаж эхлээгүй.
		Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Увс/ Багц 1: Зүүнговь цөм сүргийн нэгжийн тоног төхөөрөмж, материал	Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авсан ч, аймгийн ЗДТГ-ын аж ахуйн хашаанд байна. Барилга угсралтын ажил зарлагдан, ажлыг хүлээн авснаар ашиглаж эхлэхээр байна.
		Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Увс/ Багц 4: Чацарганы хөргүүртэй зоорины тоног төхөөрөмж, тусгаарлагч материал, сэлбэг хэрэгсэл	



“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

БАТЛАГДСАН ЗУРАГ, ТӨСӨВГҮЙ

1	Аялал жуулчлалын гол чиглэл, улсын чанартай хатуу хучилттай авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборын барилга /Увс/
2	Аялал жуулчлалын байгаль, түүх, соёлын өв бүхий газруудад ариун цэврийн байгууламж, авто зогсоол бүхий отоглох цэг /Увс, Малчин, Хяргас сум, Хяргас нуур/
3	Аялал жуулчлалын байгаль, түүх, соёлын өв бүхий газруудад ариун цэврийн байгууламж, авто зогсоол бүхий отоглох цэг /Увс, Тариалан сум, Увс нуур/
4	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Увс, Тэс сум/
5	Улаангом-Тэс хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Увс/
6	Зуухны барилгын их засвар /Увс, Улаангом сум/

УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ТООЦОО ХИЙГДЭЭГҮЙ



1. Бизнес инкубатор төвийн барилга /Увс, Улаангом сум/
2. Загвар хоршоод, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих барилга

ТӨСВИЙН ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙ

- Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.5 дахь заалтад **“Шинээр эхлэх барилга, байгууламж, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарилсан хэмжээнээс багагүй байхаар тооцож, гурван жилд багтаан санхүүжүүлж, дуусгах”**;
- Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам”-ын 3.3.4.2-т **“Шинээр эхлэх барилга, байгууламж, хөрөнгө оруулалтын төслийн нийт төсөвт өртгөөс тухайн жилд ногдох хэсэг нь төслийг хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарилсан хэмжээнээс багагүй байхаар тооцож тусгах”** гэсэн шаардлагыг хангаагүй.




1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн олон улсын стандарт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, дотуур байр, иж бүрэн хөл бөмбөгийн талбай /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр сургууль/
2. Сургуулийн барилга, 320 суудал /Увс, Бөхмөрөн сум/
3. Сургуулийн барилга, 320 суудал /Увс, Давст сум/
4. Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Увс, Тэс сум/
5. Баруун тойруугийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/
6. Увс нуур-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/
7. Турууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Баруунтуруун сум/
8. Аялал жуулчлалын байгаль, түүх, соёлын өв бүхий газруудад ариун цэврийн байгууламж, авто зогсоол бүхий отоглох цэг /Увс, Тариалан сум, Увс нуур/
9. Соёлын төвийн барилга /Увс, Малчин сум/
10. Үүрэн холбооны дахин дамжуулах сүлжээ станц /Увс, Улаангом сум, 8 дугаар баг, Сагил сум, Тариалан сум/
11. Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Увс, Давст сум/
12. Чигжийн голын хөв цөөрөм /Увс, Өндөрхангай сум/



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ


Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд нийцээгүй, тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих боломжгүй 3 төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөн байна.

Сумын төвийн тохижилт /Увс, Улаангом сум/




Улаангом сумын гэр хорооллын зам дагуу байршилтай айл өрхүүдийн хашаа, хаалгыг шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэсэн.

Сум, багийн орчныг тохижуулах "Шинэ гудамж" төсөл /Увс, Улаангом сум/



Улаангом сумын гэр хорооллын зарим багийн айл өрхүүдийн хашаанд хогийн сав, гэр хорооллын хаягжуулалт хийсэн байна.

Ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх, худалдан авах /Увс, Улаангом сум/




Тоног төхөөрөмжийг “Увс Цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК хүлээн авч Улаангом сумын Улиасны хэв гаргалгааны станцуудын хэрэглэгчдэд 1284 ширхэг, Нэгдэл дундын үйлчилгээний гаргалгааны хэрэглэгчдэд 859 ширхэг, Баруун тойрог гаргалгааны хэрэглэгчдэд 383 ширхэг, Тариалан гаргалгааны хэрэглэгчдэд 512 ширхэг, Тэс сумын Таван улиас, Хар үзүүр, Шар үзүүрийн хэрэглэгчдэд 62 ширхэг, нийт 3100 тоолуурыг үнэ төлбөргүйгээр суурилуулсан байна.



ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

Төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг хуульд нийцүүлэн боловсруулан батлуулсан байна.

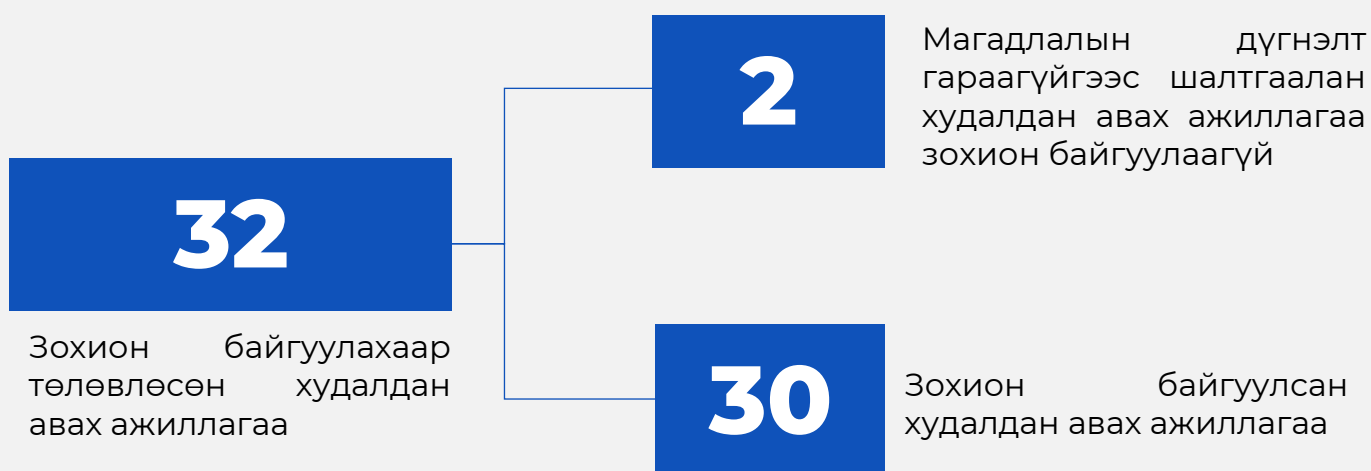

Тендер шалгаруулалтын аргыг зөв сонгон хэрэглэсэн байна.

Тендерийн хэмнэлт

241.4
сая төгрөг

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар
28 төсөл, арга хэмжээ

Харьцуулалтын тендер шалгаруулалтын аргаар
2 төсөл, арга хэмжээ




“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТ

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

Гүйцэтгэгчийг ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор хангасан ч, сонгон шалгаруулалттай холбоотой Сангийн яаманд 5 гомдол гаргасан, 1 төсөл, арга хэмжээнд гэрээ байгуулаагүй байна.

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Сангийн яамны шийдвэрлэлт
1	Багц 1: Аялал жуулчлалын гол чиглэл, улсын чанартай хатуу хучилттай авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборын барилга /Увс, Наранбулаг сум/	Дахин үнэлгээ хийх
2	Багц 1: Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Увс, Сагил, Наранбулаг, Өлгий сум/	
3	Багц 2: Сумдын цахилгаан хангамжийн шинэчлэл, өргөтгөл /Увс, Тэс сум/	
4	Багц 1: Гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй хүчдэлийн уналттай айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж /Увс, Улаангом сум/	
5	Эрчим хүчний тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл худалдан авах-Автовышка /Увс, Улаангом сум/	

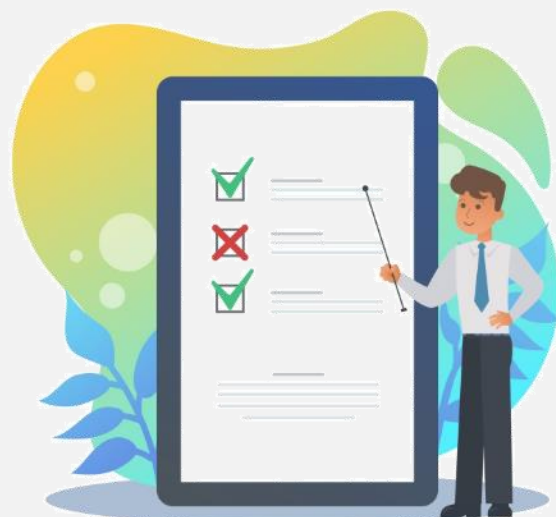

Багц 5: Хөргүүрийн агуулахын угсралт, тоног төхөөрөмж /Тэс сум/


Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан ч оролцогч оролцоогүй.



“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТ

САНХҮҮЖИЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг ажлын гүйцэтгэлд үндэслэн хууль журмын дагуу санхүүжүүлсэн байна.

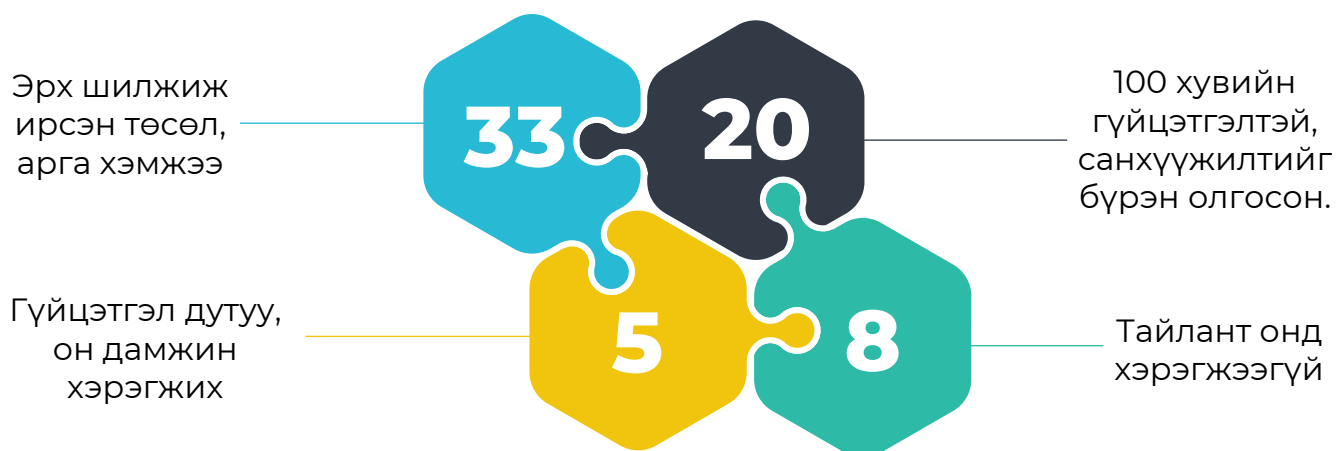

Тайлант онд бүрэн хэрэгжих эрх шилжүүлсэн 26 төсөл, арга хэмжээнээс 20 төсөл, арга хэмжээний гэрээг дүгнэсэн байна.

ГЭРЭЭ ДҮГНЭЭГҮЙ

- Ажлын хэрэгжилт хангалтгүй, ажил зогссон байдалтай;
- Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалсан;
- Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан ч оролцогч оролцоогүй;
- Тодотголоор хэрэгжих хугацааг өөрчилсөн.

1. Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг
2. Усан бассейн, спорт фитнесийн барилга /Увс, Улаангом сум/
3. Гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй хүчдэлийн уналттай айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж, Ховд сум, 1, 2 баг
4. Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Увс/ Багц 5 Хөргүүрийн агуулахын угсралт, тоног төхөөрөмж /Тэс сум/
5. Улаангом сумаас Тэс, Малчин, Хяргас, Зүүнговь, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун сумд хүртэлх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс/
6. Аймгийн хөгжимт драмын "Ойрад" театрын барилга /Увс, Улаангом сум/



“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТ

САНХҮҮЖИЛТ

Хөрөнгө оруулалтын 32 төсөл, арга хэмжээг зураг төсөв, техникийн тодорхойлолтын дагуу гүйцэтгүүлж, холбогдох хууль журамд нийцүүлэн хүлээн авсан байна.



Эрх шилжүүлсэн эсэх	Бүрэн хэрэгжсэн	Дутуу хэрэгжсэн	Огт хэрэгжээгүй
Эрх шилжүүлсэн	20	5	8
Эрх шилжүүлээгүй	12	14	7
Нийт	32	19	15

Хэрэгжиж дууссан 9 төсөл, арга хэмжээний 2,460.3 сая төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаагүй байна.

Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн бодит үр дүн гараагүй байхад төсөл, арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхээр дараагийн ажлыг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн нь тухайн хөрөнгө хэрхэн ашиглах нь тодорхойгүй байдалд хүргэсэн байна.




- Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Увс/ багц: 1 Зүүнговь цөм сүргийн нэгжийн тоног төхөөрөмж, материал
- Зуухны барилгын их засвар /Увс, Улаангом сум/
- Орон нутгийн цахилгаан болон дулаан хангамж /Улсын хэмжээнд/ Гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй хүчдэлийн уналттай айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж, Улаангом сум
- Орон нутгийн цахилгаан болон дулаан хангамж /Улсын хэмжээнд/ Сумын цахилгаан хангамжийн шинэчлэл, өргөтгөл /Увс, Тариалан сум, Хархираа баг/
- Орон нутгийн цахилгаан болон дулаан хангамж /Улсын хэмжээнд/ Сумын цахилгаан хангамжийн шинэчлэл, өргөтгөл /Увс, Тэс сум/
- Улаангом сумын 8-р цэцэрлэгийн дулааны шугамын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум/
- Эрчим хүчний тусгай зориулалтын сэлбэг материал, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Улсын хэмжээнд/ Ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх, худалдан авах /Увс, Улаангом сум/
- Гэр хорооллын дундах гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, засвар шинэчлэлтийн сэлбэг материал худалдан авах /Увс, Өлгий сум/
- Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Увс/



“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТ

САНХҮҮЖИЛТ

Хэрэгжиж дууссан 1 төсөл, арга хэмжээг данс бүртгэлд давхардуулан тусгасан.

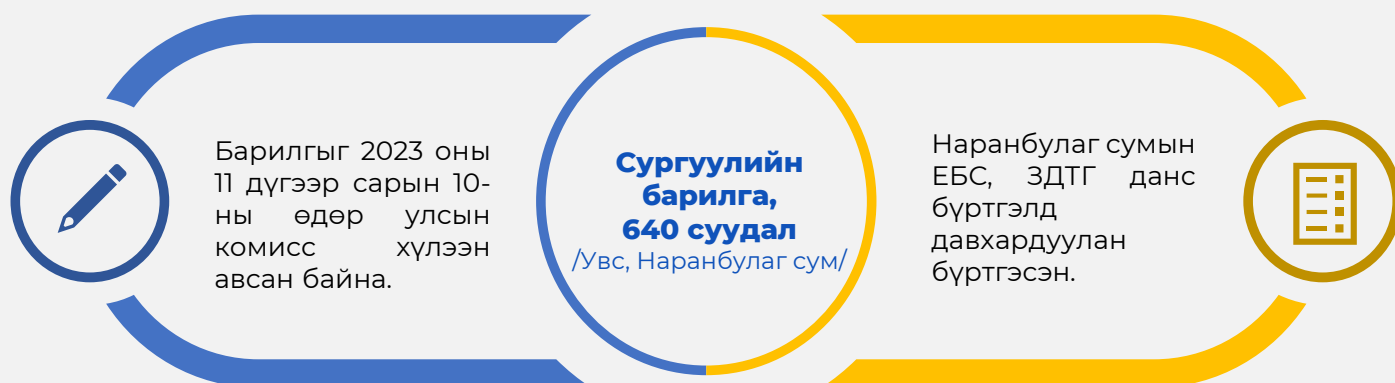

Хэрэгжиж дууссан 6 төсөл, арга хэмжээг зориулалтаар нь ашиглаж эхлээгүй байна.

№	ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР		АШИГЛАЖ ЭХЛЭЭГҮЙ ШАЛТГААН
1	Эрүүл мэндийн төвийн автомашин /Увс, Улаангом сум, 2, 8 дугаар баг/		Багийн дарга нар албан ажилдаа ашиглаж байна.
2	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Увс/ Багц 4: Чацарганы хөргүүртэй зоорины тоног төхөөрөмж, тусгаарлагч материал, сэлбэг хэрэгсэл		Барилга угсрах ажил зарлагдан, ажлыг хүлээн авснаар ашиглаж эхлэхээр хүлээгдэж байна.
3	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Увс/ Багц 1: Зүүнговь цөм сүргийн нэгжийн тоног төхөөрөмж, материал		Өвөлжөө, хаваржааны газарт модон банзан өвсний хашаа, малын хашаа баригдсан. Ашиглаж эхлээгүй байна.
4	Загвар хоршоод, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих барилгын тоног төхөөрөмж		Тоног төхөөрөмжүүд цахилгаан холболт хийгдээгүйн улмаас ашиглагдаж эхлээгүй байна.
5	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Увс/ Багц 2: Зөөлөн оёдлын тоног төхөөрөмж иж бүрдэл		Тоног төхөөрөмжүүд цахилгаан холболт хийгдээгүйн улмаас ашиглагдаж эхлээгүй байна.
6	Бизнес инкубатор төвийн барилга /Увс, Улаангом сум/		Одоогоор түрээсийн үйл ажиллагаа зарлагдаагүй, ашиглалтгүй байна.



АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ




АЙМГИЙН ИТХ, ЗАСАГ ДАРГАД:

1. Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэн хүлээн авсан 6 төсөл, арга хэмжээг зориулалтын дагуу ашиглах.



АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД:

1. Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэн хүлээн авсан 6 төсөл, арга хэмжээг зориулалтын дагуу ашиглах.



АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ:

1. Гэрээний хугацаанд бүрэн хэрэгжүүлээгүй 7 төсөл, арга хэмжээг гүйцэтгэгчээр хийлгэж хүлээн авах.
2. Улаангомьн дулааны 2-р станцын зуухны барилгын их засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын өгсөн хугацаатай үүрэг даалгаврын биелэлтийг бүрэн хангуулах.



АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАРТ:

1. Хэрэгжиж дууссан 9 төсөл, арга хэмжээний 2,460.3 сая төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгуулах.
2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн Наранбулаг сумын 640 суудалтай сургуулийн барилгыг данс бүртгэлд давхардуулан бүртгэсэн асуудлыг шийдвэрлэх.



ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН НЭГТГЭЛ ТАЙЛАНД ТУСГУУЛАХ САНАЛ:



Цаашид хууль тогтоомжид
нийцсэн төсөл, арга хэмжээг
төлөвлөн баталж байх;



Цаашид улсын төсвийн хөрөнгө
оруулалтаар хэрэгжүүлсэн
тоног төхөөрөмж дээр
сурталчилгааны чанартай
нэршил байршуулахгүй байх.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхдөө зураг төсөвгүй 6, урсгал зардлын тооцоололгүй 2, хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих боломжгүй 3, эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдлыг тооцоогүй 3, нийт төсөвт өртгөөс тухайн жилд ногдох төсвийн шаардлага хангаагүй 12 төсөл, арга хэмжээг тусгасан байна.

Төрийн үйлчилгээний анхан шатны нэгжийн тоног төхөөрөмж /Увс/ гэсэн төсөл, арга хэмжээний хүрээнд 597.9 сая төгрөгийн 22 автомашиныг, Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих “Шинэ хөдөө” төсөл Багц 3, Сумын багийн эмч нарт автомашин, тоног төхөөрөмж гэсэн төсөл, арга хэмжээний хүрээнд 279.7 сая төгрөгийн 14 автомашиныг тус тус бэлтгэн нийлүүлсэн байна. Уг автомашинууд дээр шинэ хөдөө “UBC” гэсэн бичигтэй ирсний “UBC” гэсэн нь U.vs >Увс аймаг, B.business > Бизнес, C.luster > Кластер гэсэн утгатай хувийн аж ахуйн нэгжийн гаргасан брэндийн нэрийн товчлол байна.



Дараах 5 худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, зөвлөмж чиглэл өгч ажиллах;

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 5 гомдол гаргасныг Сангийн яам хянан үзэж захиалагчийн шийдвэрийг хүчингүй болгон шийдвэрлэж, тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хуульд нийцүүлэн дахин хийхийг зөвлөмж болгосон байна. Зөвлөмжийн дагуу 4 тендерт үнэлгээний хороо дахин хуралдсан ч сонгон шалгаруулалтыг өмнөх байдлаар нь баталгаажуулсан байна. Нэг тендерт үнэлгээний хороо дахин хуралдаагүй, хянан үнэлээгүй байна. Сангийн яамны зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй, үнэлгээний хороо дахин хуралдсан ч шийдвэртээ өөрчлөлт оруулаагүй тохиолдлыг шийдвэрлэх хууль, эрх зүйн нарийвчилсан зохицуулалтгүйгээс маргаан үүсч шүүхийн байгууллагад шилжих, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт удаашрах, хэрэгжихгүй байх эрсдэл үүсгэж байна.
