



БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН



УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮНД ТӨРИЙН  
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ ОРЧИН НӨХЦӨЛ САЙЖИРЧ БАЙГАА БОЛОВЧ ТӨЛӨВЛӨЛТ  
ХУУЛЬД ЗААСАН ШААРДЛАГЫГ БҮРЭН ХАНГАХГҮЙ БАЙХ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД  
ТАВИХ ХЯНАЛТ СУЛААС ХӨРӨНГИЙН ҮР АШИГ БУУРЧ, ТӨСВИЙН ЗАРДАЛ  
НЭМЭГДЭЖ БАЙНА.

БАЯНХОНГОР ХОТ  
2024 ОН



УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  
АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

## Үндсэн мэдээлэл

### Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

УИХ-аас Баянхонгор аймагт  
хэрэгжихээр баталсан

Төсөвт өртөг 184,673.7 сая төгрөг  
Санхүүжих дүн 62,652.5 сая төгрөг

37 ТӨСӨЛ  
АРГА  
ХЭМЖЭЭ



Аймгийн ТЕЗ-чид эрх  
шилжиж ирсэн

Төсөвт өртөг 131,153.7 сая төгрөг  
Санхүүжих дүн 45,192.7 сая төгрөг

22 ТӨСӨЛ  
АРГА  
ХЭМЖЭЭ

Тайлант 2023 онд шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ батлаагүй.

### Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хийх их засварын ажил



ӨМНӨХ ОНООС  
ШИЛЖИЖ ИРСЭН

Төсөвт өртөг 1,960.5 сая төгрөг  
Санхүүжих дүн 1,085.0 сая төгрөг

8 ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

ТАЙЛАНТ ОНД ШИНЭЭР ХИЙЖ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР БАТАЛСАН

Төсөвт өртөг 583.1 сая төгрөг  
Санхүүжих дүн 438.2 сая төгрөг

9 ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

### Авто замын сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хийх ажил



ӨМНӨХ ОНООС  
ШИЛЖИЖ ИРСЭН

Төсөвт өртөг 501.2 сая төгрөг  
Санхүүжих дүн 105.0 сая төгрөг

1 ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

ТАЙЛАНТ ОНД ШИНЭЭР ХИЙЖ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР БАТАЛСАН

Төсөвт өртөг 1,442.0 сая төгрөг  
Санхүүжих дүн 1,442.0 сая төгрөг

22 ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

Баянхонгор аймгийн 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд туссан хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай төсөл, арга хэмжээ

Баянхонгор аймгийн 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаар 274.9 сая төгрөгийн 2 төсөл, арга хэмжээг тодотгон баталжээ.



УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  
АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

**Бүлэг А**

ОРОН НУТГААС САНАЛ ӨГӨӨГҮЙ, ТЭЗҮ ХИЙГЭЭГҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНД  
ТӨСӨВ БАТАЛЖ САНХҮҮЖҮҮЛСЭН НЬ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ХҮНДРЭЛ УЧРУУЛЖ  
БАЙНА



Төсвийн тухай хуулийг зөрчин орон нутгаас санал өгөөгүй 1, ТЭЗҮ хийгээгүй, магадлалаар баталгаажаагүй 3 төсөл арга хэмжээг баталснаас шалтгаалан төсөв нэмэгдэх гол шалтгаан болж байна. Үүнд



Хөдөө аж ахуйн Кластер төслийн газар тариалан, малын тэжээлийн дэд төсөл / Баянхонгор/ арга хэмжээ нь 2022 оны улсын төсөвт 2021 оны 11-р сард баталсан байхад 2022 оны 3 дугаар сард архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг хийсэн нь төлөвлөлтийн дараалал алдагдсан байна.



Сумын төвийн шинэчлэл" хөтөлбөр /Баянхонгор, Гатуут сум/-ийн төсөл, арга хэмжээг зураг төсөв хийгдээгүй байхад анх 5,000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдаж байсан бол зураг төсөв хийж, төсөвт магадлал хийлгэснээс шалтгаалан 2023 онд төсөвт өртөг 4,960.8 сая төгрөгөөр нэмэгдэж 9,960.8 сая төгрөг болж нэмэгдсэн



Сумын төвийн шинэчлэл" хөтөлбөр /Баянхонгор, Гатуут сум/-ийн төсөл, арга хэмжээг зураг төсөв хийгдээгүй байхад анх 5,000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдаж байсан бол зураг төсөв хийж, төсөвт магадлал хийлгэснээс шалтгаалан 2023 онд төсөвт өртөг 4,960.8 сая төгрөгөөр нэмэгдэж 9,960.8 сая төгрөг болж нэмэгдсэн



Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.5-д шинээр эхлэх барилга, байгууламж, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг гурван жилд багтаан санхүүжүүлэхээр заасан байхад баталсан санхүүжилтийн 2 жилийн нийлбэр тухай төсөвт өртгийн 50 хувьд ч хүрээгүй дараах 3 ажлыг баталсан нь ажил удаашрах, орхигдох үр дагавартай байна.



Гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ / Баянхонгор, Баянхонгор сум/

Нийт төсөвт өртөг 27,000.0 сая  
Энхий 2 жилд 8,825.6 сая  
34.8 %



Хөдөө аж ахуйн Кластер төслийн газар тариалан, малын тэжээлийн дэд төсөл / Баянхонгор/

Нийт төсөвт өртөг 10,000.0 сая  
Энхий 2 жилд 4,681.4 сая  
46.8 %



110/35/6 кВ-ын Баянхонгор дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл / Баянхонгор/

Нийт төсөвт өртөг 14,003.6 сая  
Энхий 2 жилд 5,984.0 сая  
45.0 %



УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  
АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС



Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн 22 төсөл, арга хэмжээний нийт 34 багц ажилд 42,305.8 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2023 онд аймгийн Төрийн сангийн дансаар дамжуулан олгосон байна.



ГЭРЭЭ  
БАЙГУУЛСАН  
ТОО

34



ГЭРЭЭ  
БАЙГУУЛСАН  
ДҮН

130,808.3  
сая төгрөг



НИЙТ ОЛГОСОН  
САНХҮҮЖИЛТ

87,312.1 сая  
төгрөг



2023 ОНД  
ОЛГОСОН  
САНХҮҮЖИЛТ

42,305.8 сая  
төгрөг

Гүйцэтгэл

81.4%



Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын нийт санхүүжих дүн 45,192.7 сая төгрөгөөс аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн дансаар нийт 41,236.2 сая төгрөгийн эрх нээлгэж төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлсэн ба 3,956.5 мянган төгрөгийн санхүүжих боломжийг алдсан байна.



Цаашид улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баталсан хөрөнгийг бүрэн ашиглахад анхаарч тайлант онд төлөвлөсөн ажлыг бүрэн хийлгэх, хугацааг баримтлахад хяналтаа сайжруулах арга хэмжээ авч ажиллахыг аймгийн Засаг даргад зөвлөмжөөр хүргүүлэв.



УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  
АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

**Бүлэг Б**

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙСЭН 22 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНЭЭС 3 НЬ ГЭРЭЭНД  
ЗААСАН ХУГАЦААГ БАРИМТЛААГҮЙ БАЙНА.

**Аймгийн ТЕЗ-чид эрх  
шилжиж ирсэн**

Төсөвт  
өртөг 131,153.7  
сая төгрөг  
Санхүүжих  
дүн 45,192.7  
сая төгрөг

22 ТӨСӨЛ  
АРГА  
ХЭМЖЭЭ

34 гэрээ  
байгуулсан

**Бүрэн хэрэгжсэн**

Төсөвт  
өртөг 42,048.3  
сая төгрөг  
Санхүүжих  
дүн 13,137.4  
сая төгрөг

13 ТӨСӨЛ  
АРГА  
ХЭМЖЭЭ

20 гэрээ  
бүрэн  
хэрэгжсэн

**Хэрэгжих шатандаа**

Төсөвт  
өртөг 89,105.4  
сая төгрөг  
Санхүүжих  
дүн 32,055.3  
сая төгрөг

9 ТӨСӨЛ  
АРГА  
ХЭМЖЭЭ

14 гэрээ  
Хэрэгжих  
шатандаа



Хөдөө аж ахуй Кластер төслийн газар тариалан, малын тэжээлийн дэд төслийн 4 багцын ажлыг хэрэгжүүлэхдээ сонгосон байршлын геологийн дүгнэлтийг харгалзаагүйгээс барьсан объектууд эвдэрсэн байна.



Баянхонгор аймагт хэрэгжсэн эрх шилжсэн 3 төсөл, арга хэмжээ, эрх шилжээгүй 1 төсөл, арга хэмжээ Монгол улсын 2021 оны Төсвийн тухай хуульд санхүүжих дүн бүрэн баталж дууссан боловч одоогийн байдлаар бүрэн хэрэгжээгүй барилга угсралтын ажил өнөөг хүртэл дуусаагүй байна. Үүнд:

**Эрх шилжсэн**

- Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/-"Нэвтгар хайрхан" ХХК
- Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Зэг сум/ "Энх баялаг констракшн" ХХК
- Дотуур байрын барилга, 75 ор /Баянхонгор, Баянбулаг сум/ - "Стандарт тоосго" ХХК

**Эрх шилжээгүй**

- Дотуур байрын барилга, 150 ор /Баянхонгор, Богд сум/-"Хорол багана констракшн" ХХК



Хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон 7,028.6 сая төгрөгийн 2 барилгыг бүртгэх шийдвэр гараагүй, байна. Тухайлбал:

- Баацагаан сумын ЭДТГ 1,560.7 сая
- Баянхонгор сумын Номгон сургуулийн барилга 5,467.9 сая
- Баянхонгор сумын усан бассейн спорт цогцолборын барилгын зөрүү 3,213.8 сая



Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын хүрээнд - 2.9 сая төгрөгийн 1 мотоцикл дутуу нийлүүлсэн  
- Өлзийт сумд нийлүүлсэн 1 ухаалаг дэлгэц гэмтэлтэй ирснийг төлбөрийн акт тогтоосон.



Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тоног төхөөрөмж нийлүүлэх болон Багийн Засаг дарга нарыг чадавхижуулах төсөл арга хэмжээний хүрээнд нийлүүлсэн нийт 27 мотоциклийн улсын дугаар аваагүй тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг эзэмшилд бүртгээгүй байна.



УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  
АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС


**Бүлэг В**

БАЯНХОНГОР АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ АШИГЛАЛТАД ОРСОН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ҮР ДҮНД АЯ ТУХТАЙ, ТААТАЙ ОРЧИНД 1,906 ХҮҮХЭД СУРЧ, 130 ХҮҮХЭД АМЬДАРЧ, 3,868 ХҮН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН СОЁЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВЧ, ХҮҮХДҮҮД БОЛОН ИРГЭД УСАН БАССЕЙН СПОРТ ЦОГЦОЛБОРТ 10 ТӨРЛИЙН СЕКЦ ДУГУЙЛАНД ХАМРАГДАХ БОЛОМЖ БҮРДСЭН БАЙНА.



Баянхонгор аймагт УТХО-аар 2023 онд хэрэгжиж байнгын ашиглалтад орсон 14 төсөл, арга хэмжээг бүрэн хүчин чадлаар ашиглаж байна.

**Ашиглалтад орсон барилга  
(сая төгрөг)**

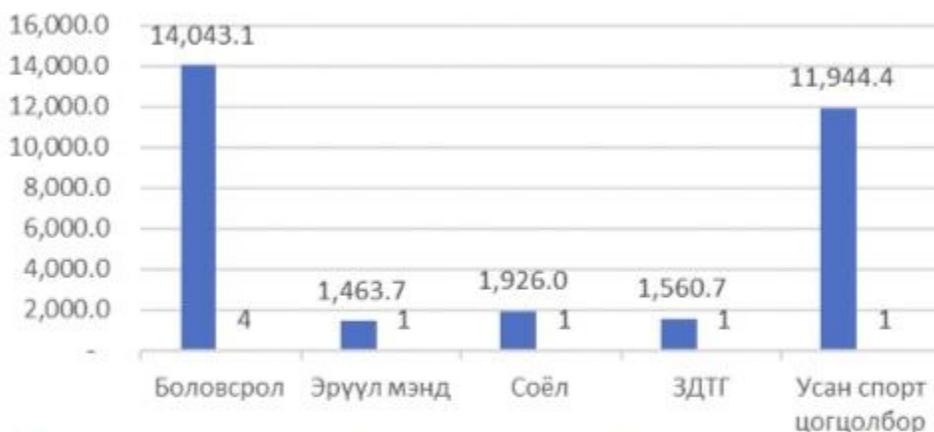

Эрдэнэмандал сургуулийн 100 ортой дотуур байранд тус сургуулийг 130 хүүхэд, Политехникийн коллежийн 70 оюутан нийт 200 орчим хүүхэд амьдарч байгаа нь хүүхдүүдийг тав тухгүй, хэт шахуу орчинд амьдрах эрсдэлийг бий болгож байна.



УТХО-аар ашиглалтад орсон Баацагаан сумын ЗДТГ, Хүрээмарал сумын ЭМТ, Баян-Овоо сумын цэцэрлэг, Эрдэнэмандал сургуулийн дотуур байр, Усан бассейн спорт цогцолборын барилга зэрэг 5 объектод ашиглалтыг явцад зөрчил дутагдал гарсанд зөрчлийг арилгах албан шаардлага хүргүүлэв.



Баянхонгор аймагт 2023 онд боловсролын салбарт 100 ортой 1 дотуур байр, 1,080 суудалтай 2 сургууль, 150 ортой 1 цэцэрлэг ашиглалтад орсноор хүүхдийн хамрагдалт 35.9 хувиар өссөн байна.



Усан бассейн спорт цогцолборын барилга ашиглалтад орсноор спортын 8 төрлийн секц дугуйлан хичээллэдэг байсан бол 10 төрлөөр секц дугуйлан хичээллэж нийт 800 гаруй хүүхэд хамрагдаж, 11 ажлын байр бий болсон.



Шинэ суурьшлын бүсийн 640 хүүхдийн сургууль, 90 хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолбор ашиглалтад орсноор шинээр ажлын байр бий болж, 102 багш, ажилтантай, сургууль 481 сурагчтай, цэцэрлэгийн 4 бүлэгт 146 хүүхэд хамрагдаж байна.



Баянхонгор сумын Эрдэнэмандал сургуулийн 100 ортой дотуур байр ашиглалтад орсноор тус сургуулийн хүүхдийн тоо нэмэгдсэнээс гадна хөдөөгийн хүүхдүүд тохилог, дулаан орчинд хичээл сургуульдаа шамдан суралцах боломжтой болсон.



УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

**Бүлэг А  
ОН**

ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТАД БАГТСАН 5 ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЭЗҮ ХИЙГЭЭГҮЙГЭЭС САНХҮҮЖҮҮЛЭЭГҮЙ БАЙНА.



Баталсан төсөл, арга хэмжээнээс 5 сумын зам засварын ажил нь төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүйгээс хэрэгжих боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн байна.

2023 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан нийт 10 төсөл, арга хэмжээнээс 3 төсөл арга хэмжээ нь дараа онд шилжихээр баталсан бөгөөд 2023 онд тус арга хэмжээнүүд нь 47.3-78.1 хувиар санхүүжихээр баталсан нь дараа оны төсөвт ачаалал үүсгэхээргүй байна.



Төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа тендерийн бичиг баримтад заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна



Нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар



Харьцуулалтын аргаар сонгон шалгаруулах

6 7  
ff Цахимаар 100 %

**Худалдан авах ажиллагааны үр дүн**



➔ Нийт төсөвт өртөг 1,759.5 сая төгрөг

➔ ХАА-ны үр дүнд бий болсон хэмнэлт 35.6 сая төгрөг

| Барилга байгууламжийн их засвар |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Баталсан санхүүжилт             | 1,523.2 сая төгрөг |
| Олгосон санхүүжилт              | 1,522.6 сая төгрөг |
| 17 ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ            |                    |

| Авто замын сан       |                    |
|----------------------|--------------------|
| Баталсан санхүүжилт  | 1,543.9 сая төгрөг |
| Олгосон санхүүжилт   | 1,375.7 сая төгрөг |
| 23 ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ |                    |

Баян-Өндөр, Баянцагаан сумын зам засварын ажлын 20,0 сая төгрөгийн ажил эхлээгүй байхад санхүүжилтийн 40,0 сая төгрөгийн барьцаа дансанд байршуулсан байгаа тул тус хөрөнгийг замын сангийн дансанд буцаан төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов.



УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  
АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

**Бүлэг Б  
ОН**

ТӨЛӨВЛӨСӨН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ХАНГУУЛАН  
АЖИЛЛАСАН БАЙНА.

## Барилга байгууламжийн их засвар

### Бүрэн хэрэгжсэн

Төсөвт 2.355.7 сая  
өртөг төгрөг  
**16 ТӨСӨЛ АРГА  
ХЭМЖЭЭ**

### Дутуу хэрэгжсэн

Төсөвт 148,0 сая  
өртөг төгрөг  
**2 ТӨСӨЛ АРГА  
ХЭМЖЭЭ**



Баян-Овоо сумын дотуур байрны их засварыг 249.9 сая төгрөгөөр "Есөн од констракшн" ХХК хийж хүлээлгэн өгсөн боловч дотор ханын засал зарим хэсгээрээ ховхорсон, шатны будаг, паркетан шалыг чанаргүй хийсэн, засварын ажлыг бүхэлдээ чанар муутай хийсэн байна.

## Авто замын сан



Замын сангаар хийсэн төсөл арга хэмжээ нь төлөвлөсөн байшилд бүрэн хийж хэрэгжүүлсэн байна.



Замын сангийн хөрөнгөөр хийсэн 16 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлсний дотор эвдэрсэн талбайд замын нөхөөсийг 1,505.5 м2 талбайд хийсэн ч Цагдаагийн газраас арван мянгатын гэрлэн дохио хүртэлх авто зам, Хас сэлбэгийн дэлгүүрийн хажуугийн авто зам, Цэлмэг өглөө дэлгүүрээс Дэлгэрэх зах хүртэлх авто зам хагарч эвдэрсэн байна.

## Захиалагчийн хяналт



Хяналтаар өгсөн даалгавар, зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй гүйцэтгэгч нартай хариуцлагыг цаг тухайд нь тооцохгүй байгаагаас Баян-Овоо сумын дотуур байрны их засварын ажил хангалтгүй, чанар муутай хийгдсэн нь тус байранд амьдарч байгаа сурагчид ая тухгүй орчинд амьдрахаас гадна төсвийн хөрөнгийн үр ашиггүй зарцуулагдах эрсдэлтэй байна.



*-Аюулгүйн тойргоос Нэгдсэн эмнэлгийн баруун хойд уулзвар хүртэл 900 метрт хатуу хучилттай авто замыг шинэчлэх ажил хийгдэж улсын комисс хүлээн авсан байхад данс бүртгэлд бүртгээгүй байна.*



УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  
АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

**Бүлэг Б  
ОН**

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙЖ БҮЙ ТӨСӨЛ АРГА  
ХЭМЖЭЭ БОДИТ ҮР ДҮНГЭЭ ӨГЧ БАЙНА.



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн төсөл,  
арга хэмжээний 86.2 хувийг хэвийн ашиглаж байна.



**Боловсролын салбарт**

Төсөвт өртөг 1,344.0 сая төгрөг

6 БАРИЛГЫН  
ЗАСВАР



**Эрүүл мэндийн  
салбарт**

Төсөвт өртөг 454.3 сая төгрөг

3 БАРИЛГЫН  
ЗАСВАР



**Зэвсэгт хүчний салбарт**

Төсөвт өртөг 40.0 сая төгрөг

2 БАРИЛГЫН  
ЗАСВАР



**Бусад салбарт**

Төсөвт өртөг 517.3 сая төгрөг

3 БАРИЛГЫН  
ЗАСВАР



*Богд сумын ЭМТ-ийн ариун цэврийн байгууламжийн ажлыг “Түйн долгио” ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд ашиглалтад орсон ариун цэврийн байгууламж нь өвлийн улиралд гаднах цэвэр болон бохир усны шугам нь хөлдсөний улмаас ашиглахгүй болсон байна.*



Галуут сумын эрүүл мэндийн төвийн хуучин халдвартын эмнэлгийн барилгад их засвар хийснээр өмнөх оны “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт”-ын аудитаар аймгийн ЭМГ-т өгсөн зөвлөмжийн дагуу ашиглалтгүй байсан шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг байрлуулан 2024 оны 1 дүгээр улирлаас эхлэн шүдний тусламж үйлчилгээг сумын ард, иргэдэд үзүүлж байна.



Баянхонгор аймагт 2023 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр боловсролын салбарын 7 барилгад 1,093.7 сая төгрөгийн их засвар хийгдснээр 1,441 хүүхдийн ая тухтай орчинд амьдарч сурч боловсрох нөхцөл бүрдсэн байна.

**Аудитаар дээрх гарсан зөрчлүүдэд дараах арга хэмжээ авч ажиллав**



Төсөвт буцаан төвлөрүүлэх 49.7 сая төгрөгийн 3 төлбөрийн акт



Зөрчил 8,069.4 сая төгрөгийн 13 албан шаардлага



Зөрчил давтан ггаргахгүй байх 100.0 сая төгрөг 7 зөвлөмж



## УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

### Дүгнэлт

Аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг гаргаж байна.

1. Баянхонгор аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд 131,153.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 45,192.7 сая төгрөгийн 22 төсөл арга хэмжээг эрх шилжүүлснээс 30,801.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 8 барилга ашиглалтад орж, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний нийт дундаж гүйцэтгэл 81.4 хувьтай байна.
  2. Төсвийн тухай хуулийг зөрчин ТЭЗҮ хийгээгүй, магадлалаар баталгаажуулаагүй төсөл, арга хэмжээг баталснаас төсвийн ачаалал нэмэгдэх, хэрэгжүүлэх үе шат хүндрэл учрах эрсдэл үүсэж байна.
  3. Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн 22 төсөл, арга хэмжээнээс 3 нь гүйцэтгэгч ажлаа дутуу хийснээс шалтгаалан 3,956.5 сая төгрөгийн санхүүжих боломжийг алдсан байна.
  4. Төсөл арга, хэмжээнд хууль тогтоомжийн дагуу захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч гүйцэтгэгчийн гаргасан зөрчил дутагдалд хариуцлага тооцохгүй байгаагаас ажлыг чанаргүй хийх байдал давтагдан гарч байна.
  5. Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн төсөл, арга хэмжээг нягтлан бодох бүртгэлд бүрэн тусгаагүй, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар засварласан 2 барилга ашиглалтгүй байна.
- Баянхонгор аймагт хэрэгжиж ашиглалтад орсон хөрөнгө оруулалтын ажлын үр дүнд ая тухтай, таатай орчинд 1,906 хүүхэд сурч, 130 хүүхэд амьдарч, 3,868 хүн эрүүл мэндийн болон соёлын үйлчилгээг авч, хүүхдүүд болон иргэд усан бассейн спорт цогцолборт 10 төрлийн секц дугуйланд хамрагдах боломж бүрдсэн байна.

### Зөвлөмж

Аудитын дүн, дүгнэлт нотлох зүйлст үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна.Үүнд:

**Нэг. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.МӨНХСАЙХАН ТАНАА:**

1. Цаашид хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зураг төсөв магадлалаар баталгаажуулаагүй байхад худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж гэрээ байгуулдаг байдлыг таслан зогсоох
2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тайлант онд төлөвлөсөн ажлыг гүйцэтгэгчээр бүрэн гүйцэтгүүлж, санхүүжүүлэхээр баталсан эх үүсвэрийг бүрэн ашиглахад анхаарч хяналтыг сайжруулах.

**ХОЁР. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗДТГ-ын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Т.Хишигбаатар танаа:**

1. Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажилд тавих хяналтыг сайжруулан ашиглалтад орсон барилгад баталгаат хугацаанд багтаан дахин хяналтыг хийж байх.
2. Ингэний сүүний үйлдвэрийн барилгын хөрөнгө оруулалтын нэмэгдсэн өртгийг мэргэжлийн байгууллагаар хянан баталгаажуулж, хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх.

**ГУРАВ. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Ц.ИДЭРМӨНХ танаа:**

1. Цаашид Хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон хөрөнгийн бүртгэлийн асуудлыг холбогдох газарт тавьж цаг тухай бүрд нь шийдвэрлүүлж байх.
2. Их засвар хийгдэж ашиглалтад орсон Заг сумын ЭМТ-ийн халдвартын эмнэлэг, Бууцагаан сумын хуучин сургуулийг ашиглаж эхлээгүй бөгөөд цаашид хөрөнгийг ашиглаж үр дүн гаргахад арга зүйгээр хангаж ажиллах

**ДӨРӨВ. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА Д.АЛТАНГЭРЭЛ танаа:**

Хяналтаар өгсөн даалгавар, зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй гүйцэтгэгч нарт Зөрчлийн тухай хуулиар тухай бүрд хариуцлага тооцож ажиллах
