



БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ”-Д ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС




БАЯНХОНГОР АЙМАГТ БУС НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН ХӨДӨӨ АЖ, АХУЙН ЧИГЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН БОЛОВЧ ТҮҮНИЙГ ҮР АШИГТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ОРОН НУТГИЙН БОДЛОГО, ШИЙДВЭР ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА.

Баянхонгор 2025 он



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

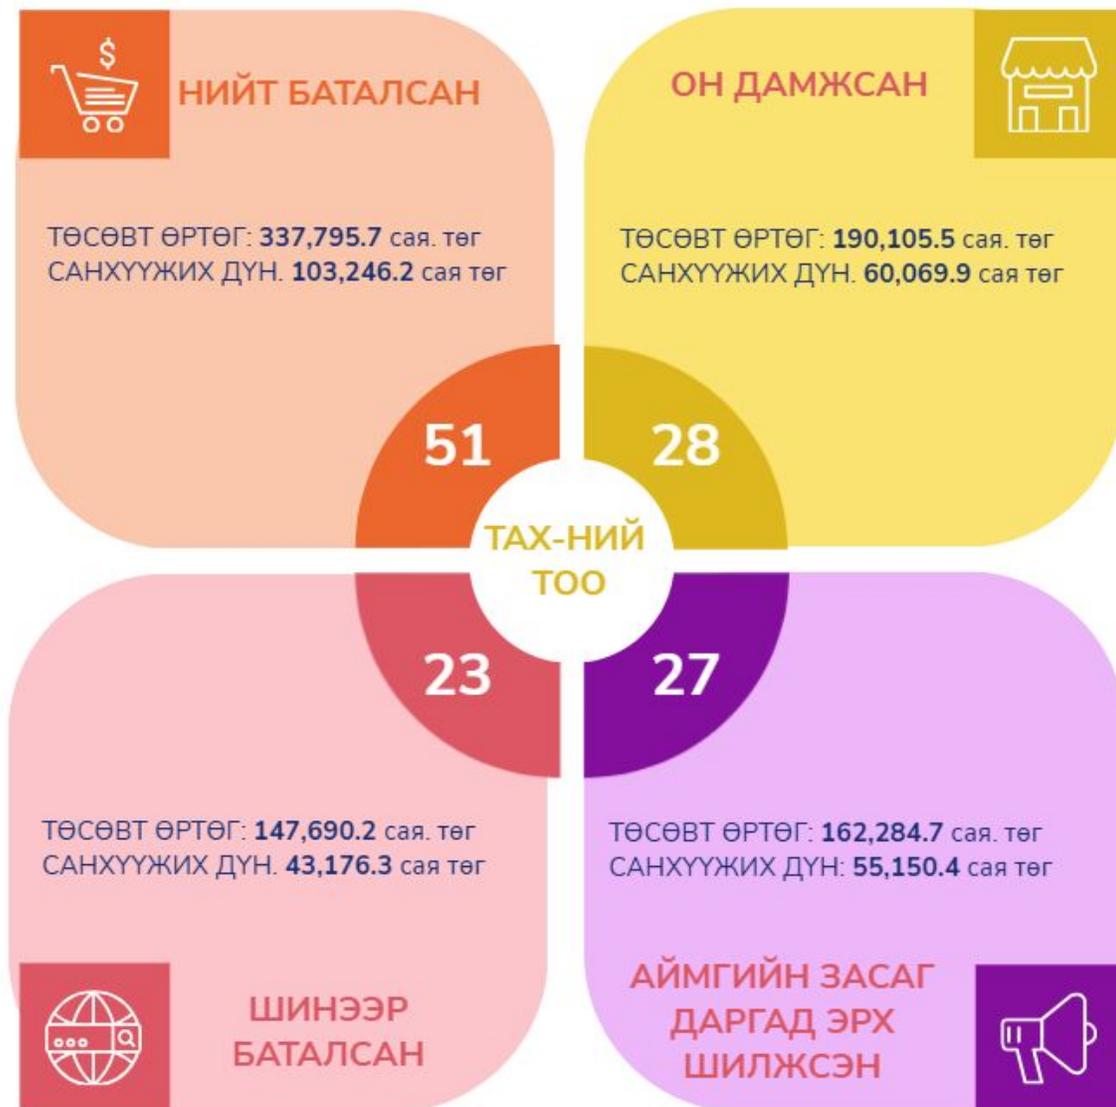

Аудитад нийт он дамжсан болон шинээр баталсан төсөл, арга хэмжээнээс аймгийн Засаг даргад эрх шилжиж ирсэн **162,284.7** сая төгрөгийн **55,150.4** сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй **27** хөрөнгө оруулалтын бараа, ажил, үйлчилгээг хамруулан шалгав.



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

Бүлэг 1

АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААС ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛЫГ ХАРГАЛЗАХГҮЙГЭЭР ТӨСӨВ БАТЛАХ ТҮВШИНД ОРУУЛСАН АЖИЛ НЬ ТЭЗҮ ХИЙЖ БАТАЛГААЖААГҮЙ, ЦААШИД ТӨСӨВ НЭМЭГДЭХ ҮР ДАГАВАР ҮҮСЭХ ЭРСДЭЛТЭЙ БАЙНА.

Жагсаалтад батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ нь “Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого”-той нийцэж байна.

ШИНЭЭР БАТАЛЖ
ЭРХ ШИЛЖСЭН:
13 төсөл, арга хэмжээ

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:
34,942.9 сая. төг

САНХҮҮЖИХ ДҮН.
17,890.4 сая төг



Алсын хараа 2050

Монгол Улсын Засгийн газрын “2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2021-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад хэрэгжүүлэхээр баталсан 6,500.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5 төсөл, арга хэмжээ нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн саналд үндэслээгүй байна.



Урьдчилсан тооцоо судалгаа хийгээгүй ТЕЗ-чийн саналд үндэслээгүй төсөл, арга хэмжээ баталснаас дараах үр дагавар үүсэж байна.

1. Малчид болон орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн үр ашиг, хөдөлмөрийн бүтээмж" төсөл



Зөрчлийг арилгах зөвлөмжийг эрх бүхий газарт хүргүүлэх саналыг Үндэсний аудитын газарт хүргүүлэв.

1. Шинэ хөдөө төсөл:

Зарим тоног, төхөөрөмж ашиглалтгүй



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС



Шинээр хэрэгжиж эхэлсэн нийт 10 ТАХ-нээс 8 арга хэмжээнд зураг төсөв шаардлагатай бөгөөд зураг төсөв баталгаажсан



Гэвч 6 ТАХ нь төсөв батлагдах үед зураг төсөв батлгаажаагүй байсан нь Төсвийн тухай хууль зөрчсөн

Иймд төсөл, арга хэмжээний төсөвлөлтийн шалгуурт магадлалын дүгнэлтийг авч үзэж байх зөвлөмжийг холбогдох газарт хүргүүлэх саналыг Үндэсний аудитын газарт хүргүүлэв.

Бүлэг 2

ТЕНДЕРИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫГ ОНОВЧТОЙ БОЛОВСРУУЛААГҮЙГЭЭС БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЧАНАРГҮЙ НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД МАРГААН ҮҮСЭХ ШАЛГААН БОЛСОН БАЙНА.



Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Аймгийн Засаг дарга 2023 оны 11 дүрээр сарын 21-ний өдөр баталж тайлант хугацаанд 2 удаа тодотгон баталж, 2024.01.01-2024.05.09-ний хооронд зохион байгууллахаар төлөвлөж зохион байгуулсан.

ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН
БАЙГУУЛСАН
13 ТАХ

ЭРХ ШИЛЖИЖ
ИРСЭН ХУГАЦАА

2023.11.22-
2024.01.31-ний
хооронд


ҮР ДАГАВАР



Зарим нэг тендерийн бичиг баримтад тусгагдсан техникийн тодорхойлолтод захиалагчийн бараа ажил үйлчилгээнд тавигдах шаардлага нарийн тодорхойлж өгөөгүй



Волейболын шал
571 м2 дутуу нийлүүлсэн



Нум сумны иж бүрдэл зах зээлийн үнээс хэт өндөр үнэтэй



Чөлөөт бөхийн дэвжээ чанар муутай



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

Бүлэг 3

ТӨСВӨӨС ОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТИЙГ ЦАГ ТУХАЙ БҮР ОЛГОЖ БАЙХАД АЖЛАА ЦАГ ХУГАЦААНДАА ГҮЙЦЭТГЭХГҮЙ АЖИЛ УДААШРУУЛАХ БАЙДАЛ ГАРСАН БАЙНА.



Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн 28 төсөл, арга хэмжээний нийт 40 багц ажилд 61,690.4 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2024 онд аймгийн Төрийн сангийн дансаар дамжуулан олгосон байна.



ГЭРЭЭ
БАЙГУУЛСАН
ТОО

40



ГЭРЭЭ
БАЙГУУЛСАН
ДҮН

150,000.5
сая төгрөг



НИЙТ ОЛГОСОН
САНХҮҮЖИЛТ

134,402.0
сая төгрөг



2024 ОНД
ОЛГОСОН
САНХҮҮЖИЛТ

61,690.4 сая
төгрөг

Гүйцэтгэл

89.6%

Тендер шалгаруулалт удааширсан шалтгаанаар Наркологийн төв эмнэлгийн барилгын ажлыг хэрэгжүүлэхэд зориулан тусгасан 774.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийг бүрэн ашиглаж чадаагүй

ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ



ГХБХБГ-ын
1 инженер



УОНХО болон
хувийн хэвшлийн 70
орчим барилгад

Жилд 3 удаа хяналт хийхэд
200 гаруй удаа хийж байгаа
хүний нөөц дутмаг байна.

Цаашид зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
эрх бүхий хуулийн этгээдээр
хяналтыг гүйцэтгүүлэх боломжтойг
аймгийн Засаг даргад зөвлөв.





УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

Бүрэн хэрэгжсэн

18 ТӨСӨЛ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ
19 БАГЦ

Төсөвт
өртөг

87,579.0
сая төгрөг

Гэрээний хугацаа дуусаагүй хэрэгжих шатандаа

10 ТӨСӨЛ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ 18
БАГЦ

Төсөвт
өртөг

74,752.0
сая төгрөг

Хэрэгжих шатандаа

3 ТӨСӨЛ
АРГА
ХЭМЖЭЭ

Төсөвт
өртөг

14,178.9
сая төгрөг



Монгол улсын Төсвийн тухай хуульд хэрэгжиж дуусах хугацаа дууссан 14,178.9 сая төгрөгийн 3 төсөл, арга хэмжээ нь гэрээний хугацаа дууссан боловч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, ажлаа бүрэн хийж дуусгаагүй байна. Үүнд:

1. Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумд “Гал Хонгор” ХХК-ийн хийж гүйцэтгэж буй Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн инженерийн шугам сүлжээ нь нийт гэрээний дүн 6,961.1 сая төгрөг



2. Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумд “Рино инженеринг” ХХК-ийн хийж гүйцэтгэж буй Сумын төвийн шинэчлэл нь гэрээний үнийн дүн 4,865.0 сая төгрөг



3. Баянхонгор аймгийн Баянбулаг сумд баригдаж буй 75 ортой сургуулийн дотуур байрны барилгын гэрээний үнийн дүн 2,167.1 сая төгрөг





УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС



Биеийн тамир, спортын салбарын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл, арга хэмжээний хүрээнд Тэнгэрийн уул ХХК нь 569.5 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулж, тоног төхөөрөмжийг 2024.07.10-ний өдөр хүлээлгэн өгсөн боловч Волейболын шал 12.8 сая, Үндэсний шагайн харвааны иж бүрдэл 4.6 сая нийт 17.4 сая төгрөгийн хөрөнгийг дутуу нийлүүлсэн тул төсөвт буцаан төвлөрүүлэх төлбөрийн акт тогтоов.



Дээрх төсөл, арга хэмжээний хүрээнд нийлүүлсэн барааны тендерийн үнийн судалгааг хийж үзэхэд техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлт бүрхэг, тодорхой бусаас шалтгаалан 24.1 сая төгрөгөөр зах зээлийн үнээс илүү үнээр нийлүүлсэн тул төсөвт буцаан төвлөрүүлэх төлбөрийн акт тогтоов.



Хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон 8 төсөл арга хэмжээний 40,112.2 сая төгрөгийн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоож хөрөнгийн бүртгэлд тусгах асуудал шийдвэрлээгүй тул данс бүртгэлд тусгах албан шаардлагыг Орон нутгийн өмчийн газарт хүргүүлэв.



1. Гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний ажлыг Б-Сорт компани 25,328.3 сая төгрөгөөр гүйцэтгэж 2024.12.20-нд хүлээн авсан боловч бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглаж эхлээгүй

2. Шинэ хөдөө төслийн хөрөнгө оруулалтаар ирсэн Баянхонгор үйлдвэрлэл хөгжлийн корпорац ОНӨҮГ-т хуваарилсан Кителийн 80 ш тоног төхөөрөмж ирснээс 371.3 сая төгрөгийн 52 ш нь ашиглалт байхгүй.

3. Хөдөө аж ахуйн кластер төслүүдийн хүрээнд бий болж буй Ингэний сүүний үйлдвэр, 1000 тн зорь, өвлийн хүлэмжүүд зэрэг томоохон бүтээн байгуулалт ашиглалтгүй байна.

Иймд хөрөнгө оруулалтаар бий болсон томоохон бүтээн байгуулалт болон үйлдвэрлэлийг бүрэн ашилаж хөрөнгийн үр ашгийг гаргах зөвлөмжийг аймгийн Засаг даргад хүргүүлэв.

Аудитаар дээрх гарсан зөрчлүүдэд дараах арга хэмжээ авч ажиллав



Төсөвт буцаан төвлөрүүлэх 41.4 сая төгрөгийн 2 төлбөрийн акт



Зөрчил арилгах 40,454.7 сая төгрөгийн 5 албан шаардлага



Зөрчил даван ггаргахгүй байх 401.9 сая төгрөг 8 зөвлөмж



УЛСЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГААС

Дүгнэлт

1. 2024 онд Баянхонгор аймагт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ нь улс болон орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдсан боловч, зарим тоног төхөөрөмж ашиглалгүй байгаагаас үзэхэд эдийн засгийн тооцоо, шинжилгээ болон төлөвлөлт муу, төрийн байгууллагын хоорондын уялдаа холбоо сул байна.
2. УИХ-аар зураг төсөлгүй, магадлал хийгдээгүй төсөл арга хэмжээ батлагддагаас шалтгаалан Төсвийн тухай хуулийн 29.4 дэх заалтыг хангаагүй зөрчил арилахгүй, төсөвт өртөг нэмэгдэх байдал их байна.
3. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг хугацаанд нь баталж, цахим системийн хэрэгжилтийг ханган, тендерийн үйл явцыг ил тод, нээлттэй зохион байгуулсан боловч үнэлгээний хороо зарим тендерийн шалгаруулалтад шаардлага хангаагүй оролцогчийг сонгосон байна.
4. Санхүүжилтийг зохиогчийн болон захиалагчийн хяналтын тайлан ажлын тоо хэмжээ нэг бүрээр тулгаж олгосон байна.
5. Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж буй Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газарт хяналт хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн хүрэлцээ дутмаг байгаагаас хяналтыг чанартай гүйцэтгэж чадахгүй байна.
6. Төсвийн тухай хуулиар хэрэгжиж дуусах хугацаа болсон гэрээний хугацаа дууссан 3 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт бүрэн дуусаагүй байна.
7. Хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авахдаа комисс дутуу хүлээн авсан байна.
8. Хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон хөрөнгийг бүрэн бүртгэж, ашиглалтыг сайжруулах шаардлагатай байна.

Зөвлөмж

Нэг. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯНХОНГОР ИТХ-Д ТОЛИЛУУЛАХ НЬ:

1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж ашиглалтад орсон Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээ, Хөдөө аж ахуйн кластер төслийн хүрээнд бий болсон Ингэний сүүний үйлдвэр, мах ногооны зоорь, өвлийн хүлэмж зэрэг томоохон төсөл арга хэмжээг бүрэн ашиглаж хөрөнгийн үр ашгийг гаргах бодлого чиглэлийг эрчимжүүлэх шийдвэр гаргах шаардлагатай байна.

Аудитын дүн, дүгнэлт нотлох зүйлст үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:

Нэг. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.МӨНХСАЙХАН ТАНАА:

1. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон томоохон бүтээн байгуулалт, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх бодлогыг холбогдох мэргэжлийн агентлаг, хэлтсүүдийг оролцуулсан ажлыг зохион байгуулж тодорхой шийдлийг гарган хэрэгжүүлэх.
2. Тендерийн баримт бичгийн техник болон хууль эрх зүйн шаардлагыг салбарын холбогдох хуульд нийцүүлэн боловсруулж байх, шалгуур үзүүлэлтийг харьцуулах боломжтой тодорхой, ойлгомжтой оруулж байх.
3. Гэрээний үүргээ хугацаандаа бүрэн биелүүлдэггүй, удаа дараа чанаргүй ажил хийсэн гүйцэтгэгчийг Сангийн яамны хар жагсаалтад оруулах хүсэлтийг уламжлах.
4. Засгийн газрын 2017 оны 170 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм”-ийн 2.9 -д заасны дагуу зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээр хяналтыг гүйцэтгүүлэх асуудлыг судалж, захиалагчийн хяналтыг сайжруулах.

Хоёр. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ДАРГА Н.БЯМБАДОРЖ ТАНАА:

5. Тендерийн баримт бичигт туссан ерөнхий шаардлагыг үнэлэх талаар үнэлгээний хорооны гишүүдэд арга, зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах.
 6. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасан зах зээлийн үнийн судалгаа хийх үүргээ хэрэгжүүлж ажиллах.
- ### ГУРАВ. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГА М.МӨНХБАТ ТАНАА:
7. Төсвийн хөрөнгөөр бий болсон хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтад тавих хяналтыг сайжруулж, хөрөнгийг техникийн тодорхойлолтын дагуу иж бүрэн хүлээн авч байх.
 8. Шинэ хөдөө, Мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн үр ашиг, хөдөлмөрийн бүтээмж төслийн хүрээнд Баянхонгор аймагт Улсын төсвийн хөрөнгөөр нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих.
